

* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro Social Campesino

Unidad Planificación del Seguro Social Campesino

Unidad de Planificación de la Dirección Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I014 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Manzano Guaranguí de la Provincia de Imbabura

Líder del Proyecto:	Villarruel Vinueza, Freed Fabián (fvillarruelv@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Dutan Erraez, Fausto	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I014	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	03/03/2016	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	Fecha del siguiente Hito:	01/01/2016

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

- Construir una infraestructura y equipamiento que permita brindar servicios de salud de calidad, calidez, integrativos e interculturales en el dispensario comunitario.
- Fortalecer la red interna de salud del IESS para la atención primaria de salud, mural y extramural a la población del sector rural.

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Médica que permita solucionar y responder a los requerimientos de salud.
2. Solucionar y responder a los requerimientos de salud de la población.
3. Incorporar el dispensario a la Red Pública de Salud.
4. Fortalecer los servicios de Salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS.

Tipo de Beneficiario

La unidad médica cubriría para el año 2020 una demanda potencial de 17,266 personas.


Restricciones

1. Tiempo de ejecución del proyecto: ejecución en 6 meses y 6 meses adicionales para la suscripción de la entrega recepción definitiva de la obra.
2. Costo: la construcción y equipamiento de la Unidad Médica tiene un costo aproximado de \$ 744.814,80, incluido IVA.
3. Alcance: Construir y equipar una unidad médica con los requerimientos técnicos de la tipología A1.

Fase Actual: Anteproyecto Definición **Planeación** Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 45.06 %

Fecha de Inicio: 05/09/2014

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

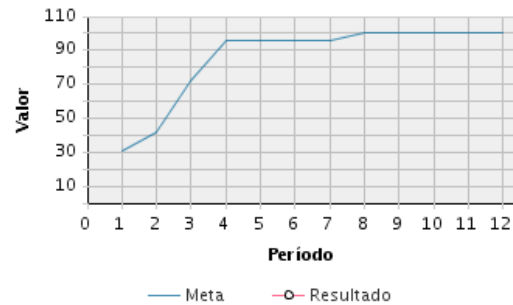

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	31 %	42 %	72 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2016 La Procuraduría General del IESS remitió el 25 de febrero de 2016 al SSC el contrato para la Fiscalización de la construcción de la unidad médica. El SSC procedió a la suscripción del contrato de Fiscalización de la construcción de la unidad médica el 29 de febrero de 2016. Por tanto, el proceso para la contratación de Fiscalización de la construcción de la unidad médica ha concluido. Con la firma del contrato de Fiscalización, corresponde al Administrador del contrato la autorización del inicio de obra. Riesgo: Una vez superado el problema que ocasionó el no inicio de la obra, es responsabilidad del Administrador el dar inicio inmediato a la ejecución de los trabajos. Hito Asociado: 8 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	03/03/2016 - 04:02 PM
ENERO 2016 El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil, responsabilidad de la Unidad de Planificación del SSC, concluyó el 11 de enero de 2016 con la suscripción de acta de negociación con el oferente. Vale señalar que el proceso de contratación de la Fiscalización estuvo a cargo de la Unidad de Planificación del SSC desde el mes de diciembre de 2015. Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización. Problema: La Unidad Financiera del SSC no puede emitir la certificación presupuestaria actualizada para la contratación de la Fiscalización, debido a que la utilización de los recursos del SSC para el	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	03/03/2016 - 04:00 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
año 2016 depende de la autorización de las autoridades del IESS. Como consecuencia de este problema, la Dirección del SSC no puede suscribir la resolución de adjudicación respectiva. Una vez solucionado el problema, corresponderá a la Procuraduría General del IESS la elaboración del respectivo contrato. Hito Asociado: 8 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.		
NOVIEMBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, la formula polinómica ha sido entregada a la Procuraduría General del IESS, tiene que revisar la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento para con este aval firmar el contrato. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se solicita certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA, por cambios en el presupuesto del contrato. Se encuentra en proceso la generación de pliegos con los términos de referencia. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Salto Galarza, Myrian Catalina	08/12/2015 - 04:33 PM
OCTUBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los términos de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Salto Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 04:57 PM
El 07 de Septiembre de 2015, se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica Manzano Guaranguí, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Salto Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 03:19 PM
AGOSTO / 2015 En el proceso COTO-SSC-2015-008, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA MANZANO GUARANGUI, se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Informe de evaluación de las ofertas y Recomendación de adjudicación del proceso de contratación de obra Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Salto Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 12:39 PM
JULIO / 2015 Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 01/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 17 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-008, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA MANZANO GUARANGUI, PROVINCIA IBARRA, CANTON IBARRA, PARROQUIA SAN MIGUEL DE IBARRA DEL SEGURO SOCIAL CAMEPSINO", por parte de la secretaría de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Salto Galarza, Myrian Catalina	03/08/2015 - 03:25 PM
JUNIO/2015:	Salto Galarza, Myrian Catalina	09/07/2015 - 06:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1 , realiza la revisión de documentos precontractuales. La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.		
ENERO 2015 La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos: 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL . 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. FEBRERO 2015 La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial MARZO 2015 Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. ABRIL 2015 El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.	Salto Galarza, Myrian Catalina	12/06/2015 - 08:51 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción	3. Planeación	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.							
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	01/01/2016	01/01/2016		▼	No	10.0
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	04/01/2016	04/01/2016		▼	No	1.15
8	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	11/01/2016	11/01/2016		▼	No	3.0
9	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	15/01/2016	15/01/2016		▼	No	3.0
10	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	29/01/2016	29/01/2016		▼	No	3.0
11	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico,, ejecutada.	3. Planeación	01/02/2016	01/02/2016		▼	No	1.14
12	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático,, ejecutada.	3. Planeación	01/02/2016	01/02/2016		▼	No	1.14
13	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario,, ejecutada.	3. Planeación	01/02/2016	01/02/2016		▼	No	1.14
14	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	12/02/2016	12/02/2016		▼	No	8.0
15	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	01/03/2016	01/03/2016		▼	No	10.0
16	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	01/03/2016	01/03/2016		▼	No	10.0
17	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	01/03/2016	01/03/2016		▼	No	10.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	07/04/2016	07/04/2016		●	No	6.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	21/04/2016	21/04/2016		●	No	5.0
20	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario., firmada.	5. Cierre	25/04/2016	25/04/2016		●	No	2.0
21	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	25/04/2016	25/04/2016		●	No	2.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento informático, realizada y firmada.	5. Cierre	25/04/2016	25/04/2016		●	No	2.0
23	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	25/04/2016	25/04/2016		●	No	4.0
24	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	25/04/2016	25/04/2016		●	No	3.0
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016		●	No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016		●	No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47 **
Monto Total del Proyecto:	664,142.28
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO




% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Aprobado Inicial	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Codificado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Comprometido	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	420,441.83	243,700.47	0.00	664,142.30
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	420,441.83	243,700.47	0.00	664,142.30
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

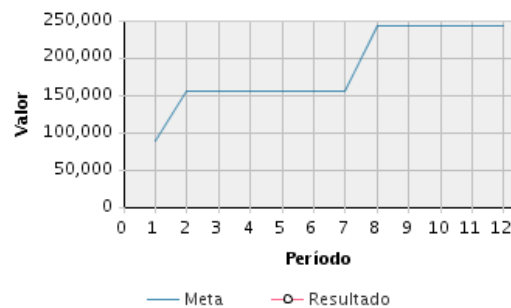

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	88,370.67		88,370.67				
Feb	66,959.13		155,329.80				
Mar	0.00		155,329.80				
Abr	0.00		155,329.80				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00		155,329.80				
Jun	0.00		155,329.80				
Jul	0.00		155,329.80				
Ago	88,370.67		243,700.47				
Sep	0.00		243,700.47				
Oct	0.00		243,700.47				
Nov	0.00		243,700.47				
Dic	0.00		243,700.47				
Total	243,700.47						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Enero 2016: Contrato de construcción suscrito, IESS-PG-2015-0119-C	Contrato_obra_MANZANO_GUARANGUI_IESS-PG-2015-0119-C.pdf	03/03/2016
2	Febrero 2016: Contrato de Fiscalización suscrito	Contrato__Fiscalización_MANZANO_GUARANGUI.pdf	03/03/2016
