

\* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro Social Campesino

**Unidad Planificación del Seguro Social Campesino**

**Unidad de Planificación de la Dirección Seguro Social Campesino**

**PROYECTO: CGP I004** Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Galtelaime de la Provincia de Chimborazo

Líder del Proyecto:	Barragán Mora, Miguel Angel (mbarraganm@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Dutan Erraez, Fausto	Programas Relacionados:	
Titular:	Durán Rodas, Efrain Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I004	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 25/08/2016
Fecha de última actualización:	06/05/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Barragán Mora, Miguel Angel	Fecha del siguiente Hito:	05/09/2014

**Nota:** Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

## DATOS GENERALES

### Descripción

- Construir una infraestructura y equipamiento que permita brindar servicios de salud de calidad, calidez, integrativos e interculturales en el dispensario comunitario.
- Fortalecer la red interna de salud del IESS para la atención primaria de salud, mural y extramural a la población del sector rural.

### Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Médica que permita solucionar y responder a los requerimientos de salud.
2. Solucionar y responder a los requerimientos de salud de la población.
3. Incorporar el dispensario a la Red Pública de Salud.
4. Fortalecer los servicios de Salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS.

### Tipo de Beneficiario

La unidad médica cubriría para el año 2020 una demanda potencial de 9.387 personas.


### Restricciones

1. Tiempo de ejecución del proyecto: ejecución en 6 meses y 6 meses adicionales para la suscripción de la entrega recepción definitiva de la obra.
2. Costo: la construcción y equipamiento de la Unidad Médica tiene un costo aproximado de \$ 736.327,05, incluido IVA.
3. Alcance: Construir y equipar una unidad médica con los requerimientos técnicos de la tipología A1.

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  **Ejecución**  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado

## AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 84.47 %  
 Fecha de Inicio: 05/09/2014 Fecha de Fin: 25/08/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	61 %	72 %	83 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ABRIL 2016</b></p> <p>Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de abril de 2016. El avance reportado es del 33,55%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra.</p> <p>Problema:</p> <p>La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.</p> <p>La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista.</p> <p>Riesgo:</p> <p>Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>17 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.</p>	Barragán Mora, Miguel Angel	06/05/2016 - 09:43 AM
<p><b>MARZO 2016</b></p> <p>De acuerdo a oficio No. IESS-UPSSC-Ch-2016-0018-MFDQ el Administrador del contrato notifica al Contratista y Fiscalizador el inicio de la misma con fecha 29 de febrero de 2016.</p> <p>En reunión de trabajo del 01 de marzo de 2016 la Unidad de Planificación del SSC entregó al Administrador del contrato la documentación del contrato de fiscalización y además, una "MATRIZ DE ANÁLISIS DEL AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA", la cual debe ser entregada</p>	Barragán Mora, Miguel Angel	04/04/2016 - 06:12 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>al final de cada mes por el Administrador con el reporte del avance económico de obra. El acta de la reunión se remitió al Administrador el 04 de marzo de 2016 a través del Memorando No. IESS-DSSC-2016-0659-M.</p> <p>Se adjunta el reporte de avance de obra remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de marzo de 2016. El avance reportado es del 21,57%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra.</p> <p>Por otro lado, para proceder a la ejecución de los demás componentes del proyecto, y en base a las responsabilidades establecidas en la Resolución No. CD 457, Reglamento Orgánico Funcional del IESS, la Dirección del Seguro Social Campesino solicitó el 18 de marzo de 2016, Memorando No. IESS-DSSC-2016-0804-M, a la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento los expedientes técnicos completos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el objeto de iniciar los respectivos procesos de contratación.</p> <p>Problema:</p> <p>La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es estrictamente de responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.</p> <p>La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad absoluta del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista.</p> <p>Riesgo:</p> <p>Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>16 EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.</p>		
<p><b>FEBRERO 2016</b></p> <p>La Procuraduría General del IESS remitió el 25 de febrero de 2016 al SSC el contrato para la Fiscalización de la construcción de la unidad médica.</p> <p>El SSC procedió a la suscripción del contrato de Fiscalización de la construcción de la unidad médica el 29 de febrero de 2016. Por tanto, el proceso para la contratación de Fiscalización de la construcción de la unidad médica ha concluido.</p> <p>Con la firma del contrato de Fiscalización, corresponde al Administrador del contrato la autorización del inicio de obra.</p> <p>Riesgo:</p> <p>Una vez superado el problema que ocasionó el no inicio de la obra, es responsabilidad del Administrador el dar inicio inmediato a la ejecución de los trabajos.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>14 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.</p>	<p>Barragán Mora, Miguel Angel</p>	<p>03/03/2016 - 04:36 PM</p>
<p><b>ENERO 2016</b></p> <p>El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil, responsabilidad de la Unidad de Planificación del SSC, concluyó el 08 de enero de 2016 con la suscripción de acta de negociación con el oferente.</p>	<p>Barragán Mora, Miguel Angel</p>	<p>03/03/2016 - 04:35 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Vale señalar que el proceso de contratación de la Fiscalización estuvo a cargo de la Unidad de Planificación del SSC desde el mes de diciembre de 2015.</p> <p>Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización.</p> <p>Problema:</p> <p>La Unidad Financiera del SSC no puede emitir la certificación presupuestaria actualizada para la contratación de la Fiscalización, debido a que la utilización de los recursos del SSC para el año 2016 depende de la autorización de las autoridades del IESS. Como consecuencia de este problema, la Dirección del SSC no puede suscribir la resolución de adjudicación respectiva.</p> <p>Una vez solucionado el problema, corresponderá a la Procuraduría General del IESS la elaboración del respectivo contrato.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>14 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.</p>		
<p>ENERO 2016:De lo Planificado para el periodo de enero 2016, se ha cumplido, con el arrastre de algunas actividades planificadas en el 2015 Anticipo de obra entregado a contratista. TDR para contratación de Fiscalizador aprobado.</p>	Barragán Mora, Miguel Angel	04/02/2016 - 01:58 PM
<p>NOVIEMBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, se encuentra firmado el contrato y en proceso del pago del anticipo. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito</p> <p>Para la contratación de fiscalizador de obra: se solicita certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA, por cambios en el presupuesto del contrato. Se encuentra en proceso la generación de pliegos con los términos de referencia. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	08/12/2015 - 04:14 PM
<p>OCTUBRE / 2015</p> <p>Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los término de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 03:55 PM
<p>SEPTIEMBRE / 2015 Se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica GALTELAIME, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, el 01 de Septiembre. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 02:28 PM
<p>AGOSTO / 2015</p> <p>En el proceso COTO-SSC-2015-011, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA GALTELAIME, se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Informe de evaluación de las ofertas y Recomendación de adjudicación del proceso de contratación de obra Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 02:39 PM
<p>JULIO / 2015 Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 03/07/2015.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	03/08/2015 - 03:04 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-011, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA GALTELAIME, PROVINCIA CHIMBORAZO, CANTON GUAMOTE, PARROQUIA PALMIRA DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO" por parte de la secretaria de la comisión.</p> <p>La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes.</p> <p>Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN</p>		
<p>JUNIO/2015:</p> <p>La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de documentos precontractuales.</p> <p>La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino</p> <p>La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1.</p> <p>Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com.</p> <p>Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.</p>	<p>Salto Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>09/07/2015 - 11:01 AM</p>
<p>ENERO 2015</p> <p>La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015.</li> <li>3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL .</li> <li>2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional.</li> <li>3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar</li> <li>4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura.</li> </ol> <p>FEBRERO 2015</p> <p>La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial</p> <p>MARZO 2015</p> <p>Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento.</p> <p>ABRIL 2015</p> <p>El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY.</p> <p>La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA</p> <p>MAYO 2015</p> <p>.La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico Afín Objeto de Contratación.</p> <p>.La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.</p>	<p>Salto Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>12/06/2015 - 08:41 AM</p>

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto
No hay información disponible

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014	05/09/2014		▼	No	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015	27/02/2015		▼	No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015	06/03/2015		▼	No	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	06/07/2015	06/07/2015		▼	No	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/08/2015	28/08/2015		▼	No	1.14
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	30/11/2015	30/11/2015		▼	No	10.0
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	23/12/2015	23/12/2015		▼	No	1.15
8	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico, ejecutada.	3. Planeación	07/01/2016	07/01/2016		▼	No	1.14
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático, ejecutada.	3. Planeación	07/01/2016	07/01/2016		▼	No	1.14
10	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario, ejecutada.	3. Planeación	07/01/2016	07/01/2016		▼	No	1.14
11	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	18/01/2016	18/01/2016		▼	No	3.0
12	EJECUCIÓN: Contrato de equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	18/01/2016	18/01/2016		▼	No	10.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	18/01/2016	18/01/2016		▼	No	10.0
14	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	18/01/2016	18/01/2016		▼	No	3.0
15	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	18/01/2016	18/01/2016		▼	No	10.0
16	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	01/02/2016	01/02/2016		▼	No	3.0
17	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	17/02/2016	17/02/2016		▼	No	8.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	16/03/2016	16/03/2016		▼	No	6.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	30/03/2016	30/03/2016		▼	No	5.0
20	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario, firmada.	5. Cierre	24/04/2016	24/04/2016		▼	No	2.0
21	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico , realizada y firmada.	5. Cierre	24/04/2016	24/04/2016		▼	No	2.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	24/04/2016	24/04/2016		▼	No	2.0
23	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	24/04/2016	24/04/2016		▼	No	4.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	24/04/2016	24/04/2016			No	3.0
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**MONTO TOTAL DEL PROYECTO**

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47 **
Monto Total del Proyecto:	664,142.28
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% MONTO TOTAL DEVENGADO**




% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2016				
	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Aprobado Inicial	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Codificado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Comprometido	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	420,441.81	243,700.47	0.00	664,142.28
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	420,441.81	243,700.47	0.00	664,142.28
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016**

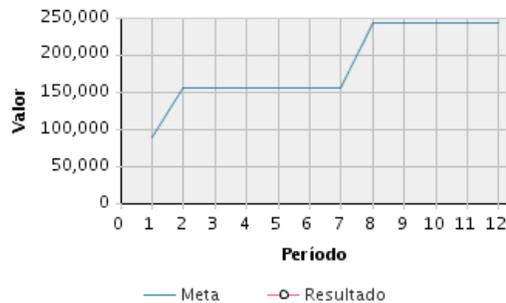

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	88,370.67		88,370.67				
Feb	66,959.13		155,329.80				
Mar	0.00		155,329.80				
Abr	0.00		155,329.80				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00		155,329.80				
Jun	0.00		155,329.80				
Jul	0.00		155,329.80				
Ago	88,370.67		243,700.47				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>243,700.47</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos
No hay información disponible

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ABRIL 2016: Reporte avance de obra abril 2016	ABRIL_-_IESS_PR_-_GALTELAIME.pdf	06/05/2016
2	Abril 2016: Reporte fotográfico abril 2016	Abril_-_fotos_-_Galtelaime.pdf	06/05/2016
3	Enero 2016: Contrato de construcción suscrito.	Contrato_CONSTRUCCION_GALTELAIME.pdf	03/03/2016
4	Febrero 2016: Contrato de Fiscalización suscrito	Contrato_Fiscalización_GALTELAIME.pdf	03/03/2016
5	Marzo 2016: Oficio de inicio de obra y reporte de avance de obra	IESS-PR_GALTELAIME_-_MARZO_2016.pdf	04/04/2016
