

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro Social Campesino**

Unidad Planificación del Seguro Social Campesino

Unidad de Planificación de la Dirección Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I010 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Milagro 2 de la Provincia de El Oro

Líder del Proyecto:	Barragán Mora, Miguel Angel (mbarraganm@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Martínez Hernández, Raul Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I010	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	252,225.99
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 25/08/2016
Fecha de última actualización:	05/07/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Barragán Mora, Miguel Angel	Fecha del siguiente Hito:	04/01/2016

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

- Construir una infraestructura y equipamiento que permita brindar servicios de salud de calidad, calidez, integrativos e interculturales en el dispensario comunitario.
- Fortalecer la red interna de salud del IESS para la atención primaria de salud, mural y extramural a la población del sector rural.

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Médica que permita solucionar y responder a los requerimientos de salud.
2. Solucionar y responder a los requerimientos de salud de la población.
3. Incorporar el dispensario a la Red Pública de Salud.
4. Fortalecer los servicios de Salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS.

Tipo de Beneficiario

La unidad médica cubriría para el año 2020 una demanda potencial de 3,041 personas.


Restricciones

1. Tiempo de ejecución del proyecto: ejecución en 6 meses y 6 meses adicionales para la suscripción de la entrega recepción definitiva de la obra.
2. Costo: la construcción y equipamiento de la Unidad Médica tiene un costo aproximado de \$ 794.513,80, incluido IVA.
3. Alcance: Construir y equipar una unidad médica con los requerimientos técnicos de la tipología A1.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 93.07 %

Fecha de Inicio: 05/09/2014

Fecha de Fin: 25/08/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

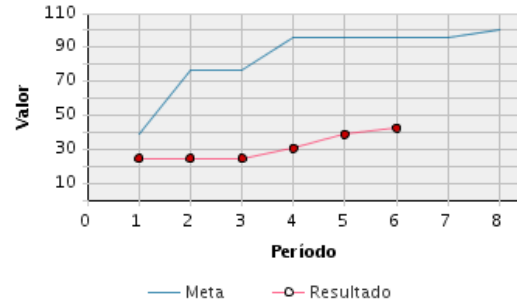

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	39 %	77 %	77 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	25 %	25 %	25 %	31 %	39 %	43 %						
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016 El 09 de mayo de 2016, por pedido de la Dirección Nacional de Planificación, se actualiza las fechas de cumplimiento de los hitos y se ingresan los datos de ejecución reales del proyecto. La columna "fecha comprometida" de los hitos no ha sido modificada en lo absoluto, por tanto corresponde a la planificación original realizada por la Subdirección de Control del SSC. Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Administrador y Fiscalizador, correspondiente al mes de junio de 2016. El avance reportado a la fecha es del 38,31%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Riesgo: La Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, DNIE, a través de Memorando No. IESS-DNIE-2016-0602-M de 13 de junio de 2016, remitió al Seguro Social Campesino los expedientes técnicos de los componentes de mobiliario y equipamiento médico; sin embargo, el SSC devolvió los expedientes a la DNIE, por medio de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1664-M de 21 de junio de 2016, debido a que no contienen toda la documentación técnica requerida para la contratación a través del portal de compras públicas. Hasta la presente fecha la DNIE no ha remitido los expedientes técnicos completos y corregidos al SSC. Hito Asociado: 19 EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.	Barragán Mora, Miguel Angel	05/07/2016 - 02:24 PM
MAYO 2016 El 09 de mayo de 2016, por pedido de la Dirección Nacional de Planificación, se actualiza las fechas de cumplimiento de los hitos y se ingresan los datos de ejecución reales del proyecto. Vale aclarar que la Unidad de Planificación del SSC ha solicitado en reiteradas ocasiones a la DNPL la autorización para modificar, entre otros, los hitos y los montos de ejecución del proyecto, sin que hasta la fecha haya sido atendido el requerimiento. La autorización de modificación solicitada se realiza debido a que la Unidad de Planificación del SSC se ha visto inmersa a partir del mes de enero del 2016 en el ingreso de datos del proyecto al IESS-PR, ya que ha encontrado	Barragán Mora, Miguel Angel	06/06/2016 - 10:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
falencias técnicas en la información ingresada antes del año 2016 por la Subdirección de Control del SSC. La columna "fecha comprometida" de los hitos no ha sido modificada en lo absoluto, por tanto corresponde a la planificación original realizada por la Subdirección de Control del SSC. Se solicita que cualquier pedido de la DNPL a la Unidad de Planificación del SSC sobre el cambio de los datos del proyecto que fueron ingresados en esta herramienta por la Subdirección de Control del SSC, deberá en adelante solicitarse de manera oficial tal requerimiento. Cabe indicar que el 25 de mayo de 2016, a través de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1445-M, la Dirección del SSC insistió a los Administradores de contrato en el envío oportuno de la información de avance de obra del proyecto. Por otro lado, se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Administrador, correspondiente al mes de mayo de 2016. El avance reportado es del 31,23%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino. La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, DNIE, la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Cabe señalar que el Seguro Social Campesino requirió a la DNIE la información técnica detallada en el párrafo superior el 18 de marzo de 2016, Memorando No. IESS-DSSC-2016-0840-M, e insistió el 05 de mayo de 2016 en el requerimiento, Memorando No. IESS-DSSC-2016-1287-M. Hito Asociado: 15 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.		
ABRIL 2016 El 14 de abril de 2016 el Director del Seguro Social Campesino, Dr. Fausto Dután Erraéz, nombró a la Ing. Andrea Jiménez Ríos, funcionaria de la Unidad Provincial del SSC El Oro, como Fiscalizadora de la construcción de la unidad médica Milagro 2. El Administrador del contrato fue notificado de este nombramiento por medio de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1084-M. Por tanto, el proceso para la contratación de Fiscalización de la construcción de la unidad médica ha concluido. Con la designación oficial de la Fiscalización de la obra, corresponde al Administrador del contrato la autorización del inicio de obra. Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de abril de 2016. El avance reportado es del 26.57%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Problema:	Barragán Mora, Miguel Angel	06/05/2016 - 10:04 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino. La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Hito Asociado: 14 EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.		
MARZO 2016 El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil, responsabilidad de la Unidad de Planificación del SSC, concluyó el 23 de marzo de 2016 con la suscripción del 'Acta No. 05-2016 de revisión de convalidaciones, calificación de oferta y recomendaciones del proceso'. Problema: Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección del Seguro Social Campesino el acoger o no la recomendación realizada en relación a la calificación del oferente invitado para la Fiscalización. Hito Asociado: 8 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	Barragán Mora, Miguel Angel	04/04/2016 - 06:15 PM
FEBRERO 2016 El problema suscitado en el mes de enero de 2016 y que impedía la reapertura del proceso de contratación del Fiscalizador ha sido solucionado con la entrega, por parte de la Unidad Financiera y de la Subdirección de Control del SSC, de la certificaciones PAC, Presupuestaria y de Disponibilidad de IVA, medios obligatorios para proceder con la reapertura del proceso indicado. Vale aclarar que las certificaciones indicadas fueron recibidas por la Unidad de Planificación del SSC el 24 y el 26 de febrero de 2016, por lo que a partir de las fechas indicadas se inicia la preparación de la documentación para la reapertura del proceso. Hito Asociado: 9 PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Barragán Mora, Miguel Angel	03/03/2016 - 04:37 PM
ENERO 2016 El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil no pudo concluir debido a que el proceso se declaró desierto en razón de que el oferente no subió su oferta al portal de compras públicas. Vale señalar que el proceso de contratación de la Fiscalización estuvo a cargo de la Unidad de Planificación del SSC desde el mes de diciembre de 2015.	Barragán Mora, Miguel Angel	03/03/2016 - 04:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización. Problema: La Unidad de Planificación del SSC no puede reaperturar el proceso de contratación de la Fiscalización debido a que la utilización de los recursos del SSC para el año 2016 depende de la autorización de las autoridades del IESS. Hito Asociado: 9 PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.		
NOVIEMBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, se encuentra firmado el contrato y en proceso del pago del anticipo. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se solicita certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA, por cambios en el presupuesto del contrato. Se encuentra en proceso la generación de pliegos con los términos de referencia. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	08/12/2015 - 04:29 PM
OCTUBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los término de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 04:26 PM
El 07 de Septiembre. se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica Milagro 2, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 02:55 PM
AGOSTO / 2015 En el proceso COTO-SSC-2015-005, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MILAGRO 2, se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Evaluación de las ofertas Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 01:07 PM
JULIO / 2015 Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 02/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-005, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MILAGRO 2, PROVINCIA EL ORO, CANTON ATAHUALPA, PARROQUIA MILAGRO DEL SEGURO SOCIALCAMPESINO", por parte de la secretaría de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 01:07 PM
JUNIO/2015: La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de documentos precontractuales.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	09/07/2015 - 03:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.		
ENERO 2015 La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos: 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL . 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Médico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. FEBRERO 2015 La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial MARZO 2015 Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. ABRIL 2015 El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.	Salto Galarza, Myrian Catalina	12/06/2015 - 08:45 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	5. Cierre	02/07/2015		02/07/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	30/11/2015		27/11/2015		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	04/01/2016		27/11/2015		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	04/01/2016		14/04/2016		Sí	3.0
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	04/01/2016		30/12/2015		Sí	1.15
10	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico, ejecutada.	3. Planeación	04/01/2016	04/01/2016			No	1.14
11	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático, ejecutada.	3. Planeación	04/01/2016	04/01/2016			No	1.14
12	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario, ejecutada.	3. Planeación	04/01/2016	04/01/2016			No	1.14
13	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	16/01/2016	16/01/2016			No	5.0
14	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	18/01/2016		30/04/2016		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	01/02/2016		31/05/2016		Sí	8.0
16	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	25/02/2016	25/02/2016			No	10.0
17	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	25/02/2016	25/02/2016			No	10.0
18	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	25/02/2016	25/02/2016			No	10.0
19	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	01/04/2016		30/06/2016		Sí	4.0
20	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	22/04/2016	22/04/2016			No	3.0
21	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	25/04/2016	25/04/2016			No	6.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario, firmada.	5. Cierre	29/04/2016	29/04/2016			No	2.0
23	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	29/04/2016	29/04/2016			No	2.0
24	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico , realizada y firmada.	5. Cierre	29/04/2016	29/04/2016			No	2.0
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	252,225.99 **
Monto Total del Proyecto:	689,718.84
Total Devengado:	88,051.36
% Monto Total Devengado:	12.77 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO




% Monto Total Devengado: 12.77 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Ppto. Aprobado Inicial	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Ppto. Codificado	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Ppto. Comprometido	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	437,492.85	252,225.99	0.00	689,718.84
Ppto. Devengado	0.00	88,051.36	0.00	88,051.36
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	437,492.85	252,225.99	0.00	689,718.84
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	34.91 %	0.00 %	12.77 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

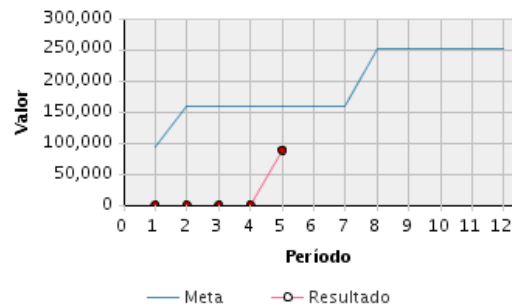

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	92,633.43	0.00	92,633.43	0.00	0.00 %		0.00 %
Feb	66,959.13	0.00	159,592.56	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	159,592.56	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	0.00	0.00	159,592.56	0.00	0.00 %		0.00 %
May	0.00	88,051.36	159,592.56	88,051.36	55.17 %		34.91 %
Jun	0.00		159,592.56				
Jul	0.00		159,592.56				
Ago	92,633.43		252,225.99				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	252,225.99	88,051.36					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Abril 2016: Nombramiento FISCALIZACION	Nombramiento_Ing_Jimenez_FISC_Milagro2.pdf	06/05/2016
2	ABRIL 2016: Reporte avance de obra abril 2016	ABRIL_-_IESSPR_-_MILAGRO_2.pdf	06/05/2016
3	Abril 2016: Reporte fotográfico abril 2016	Abril_-_fotos_-_Milagro_2.pdf	06/05/2016
4	Enero 2016: Contrato de contrucción suscrito.	Contrato__CONSTRUCCION_MILAGRO_2.pdf	03/03/2016
5	Junio 2016: Reporte avance de obra y anexo fotográfico	JUNIO_-_IESSPR_-_MILAGRO_2_-_AVANCE_Y_FOTOS.pdf	05/07/2016
6	Mayo 2016: Anexo fotográfico de avance de obra	MAYO_-_MILAGRO_2_-_FOTOS_IESSPR.pdf	06/06/2016
7	Mayo 2016: Reporte avance de obra	MAYO_-_MILAGRO_2_-_A.V.IESSPR.pdf	06/06/2016
