

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro Social Campesino**

Unidad Planificación del Seguro Social Campesino

Unidad de Planificación de la Dirección Seguro Social Campesino

PROYECTO: I014 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Huayrapungo de la Provincia de El Cañar

Líder del Proyecto:	Villarruel Vinueza, Freed Fabián (fvillarruelv@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Martínez Hernández, Raul Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 29/08/2016
Fecha de última actualización:	05/07/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	Fecha del siguiente Hito:	03/03/2016

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer la red de servicios de salud en el primer nivel de atención para mejorar la calidad del servicio que privilegie la prevención y promoción de los estilos de vida saludables en la Unidad Medica Huayrapungo, ubicada en el cantón Cañar, provincia Cañar. Brindar servicios y prestaciones de calidad a los asegurados del Seguro Social Campesino, para el acceso y ejercicio pleno de los derechos de la Seguridad Social, dotando a la comunidad de una unidad médica del primer nivel de atención tipo A1, acorde a la homologación aprobada por el Seguro Social Campesino del IESS.

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Medica de Salud tipo A1 en el cantón Cañar, provincia Cañar.
2. Solucionar y Responder a los requerimientos de salud de el cantón Cañar, provincia Cañar
3. Incorporar el dispensario de la zona a la Red Publica de Salud.
4. Fortalecer la prevención y promoción de salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS

Tipo de Beneficiario

Afiliados, beneficiarios y jubilados del Seguro Social Campesino y población en general.
Cubre a 1.074 personas beneficiarias al SSC y la población adscrita es de 8.421 personas.


Restricciones

1. Tiempo de ejecución del Proyecto. Ejecución en 6 meses
2. Costo: la construcción y equipamiento del la Unidad Medica tiene un costo aproximado de \$664.142,28
3. Alcance: Construir y equipar una Unidad con los requerimientos técnicos de la tipología A1

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 92.55 %

Fecha de Inicio: 05/09/2014

Fecha de Fin: 29/08/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

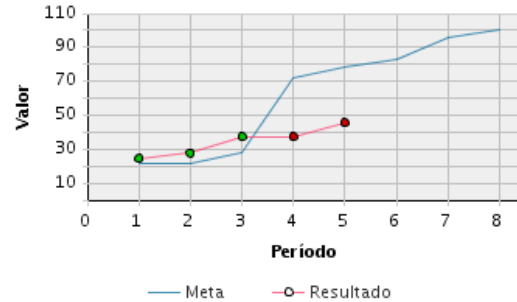

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	22 %	22 %	28 %	72 %	78 %	83 %	96 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	25 %	28 %	38 %	38 %	46 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016 El 09 de mayo de 2016, por pedido de la Dirección Nacional de Planificación, se actualiza las fechas de cumplimiento de los hitos y se ingresan los datos de ejecución reales del proyecto. La columna "fecha comprometida" de los hitos no ha sido modificada en lo absoluto, por tanto corresponde a la planificación original realizada por la Subdirección de Control del SSC. Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Administrador y Fiscalizador, correspondiente al mes de junio de 2016. El avance reportado a la fecha es del 24,98%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Por otro lado, cumpliendo con la "Normativa para el ejercicio de las terapias alternativas" emitida por el Ministerio de Salud Pública a través de la Norma No. 000037 de 25 de abril de 2016, la Unidad de Planificación del SSC remitió al Fiscalizador de obra, a través de correo electrónico de 25 de mayo de 2016, las directrices para la implementación de un área destinada a desarrollar el enfoque intercultural en salud en la unidad médica, las cuales se adjuntan. Riesgo: La Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, DNIE, a través de Memorando No. IESS-DNIE-2016-0602-M de 13 de junio de 2016, remitió al Seguro Social Campesino los expedientes técnicos de los componentes de mobiliario y equipamiento médico; sin embargo, el SSC devolvió los expedientes a la DNIE, por medio de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1664-M de 21 de junio de 2016, debido a que no contienen toda la documentación técnica requerida para la contratación a través del portal de compras públicas. Hasta la presente fecha la DNIE no ha remitido los expedientes técnicos completos y corregidos al SSC. Hito Asociado: 17 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	05/07/2016 - 04:15 PM
MAYO 2016	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	06/06/2016 - 11:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El 09 de mayo de 2016, por pedido de la Dirección Nacional de Planificación, se actualiza las fechas de cumplimiento de los hitos y se ingresan los datos de ejecución reales del proyecto. Vale aclarar que la Unidad de Planificación del SSC ha solicitado en reiteradas ocasiones a la DNPL la autorización para modificar, entre otros, los hitos y los montos de ejecución del proyecto, sin que hasta la fecha haya sido atendido el requerimiento. La autorización de modificación solicitada se realiza debido a que la Unidad de Planificación del SSC se ha visto inmersa a partir del mes de enero del 2016 en el ingreso de datos del proyecto al IESS-PR, ya que ha encontrado falencias técnicas en la información ingresada antes del año 2016 por la Subdirección de Control del SSC. La columna "fecha comprometida" de los hitos no ha sido modificada en lo absoluto, por tanto corresponde a la planificación original realizada por la Subdirección de Control del SSC. Se solicita que cualquier pedido de la DNPL a la Unidad de Planificación del SSC sobre el cambio de los datos del proyecto que fueron ingresados en esta herramienta por la Subdirección de Control del SSC, deberá en adelante solicitarse de manera oficial tal requerimiento. Cabe indicar que el 25 de mayo de 2016, a través de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1445-M, la Dirección del SSC insistió a los Administradores de contrato en el envío oportuno de la información de avance de obra del proyecto. Por otro lado, se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra, correspondiente al mes de mayo de 2016. El avance reportado es del 27,62%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino. La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, DNIE, la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Cabe señalar que el Seguro Social Campesino requirió a la DNIE la información técnica detallada en el párrafo superior el 18 de marzo de 2016, Memorando No. IESS-DSSC-2016-0840-M, e insistió el 05 de mayo de 2016 en el requerimiento, Memorando No. IESS-DSSC-2016-1287-M. Hito Asociado: 17 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.		
ABRIL 2016 Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de abril de 2016. El avance reportado es del 18,07%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	06/05/2016 - 09:28 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Hito Asociado: 17 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.		
MARZO 2016 El Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista procedieron el 14 de marzo de 2016 a la suscripción del acta de inicio de la ejecución del contrato de obra. En reunión de trabajo del 01 de marzo de 2016 la Unidad de Planificación del SSC entregó al Administrador del contrato la documentación del contrato de fiscalización y además, una "MATRIZ DE ANÁLISIS DEL AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA", la cual debe ser entregada al final de cada mes por el Administrador con el reporte del avance económico de obra. El acta de la reunión se remitió al Administrador el 04 de marzo de 2016 a través del Memorando No. IESS-DSSC-2016-0659-M. Se adjunta el reporte de avance de obra remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de marzo de 2016. El avance reportado es del 5,80%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Por otro lado, para proceder a la ejecución de los demás componentes del proyecto, y en base a las responsabilidades establecidas en la Resolución No. CD 457, Reglamento Orgánico Funcional del IESS, la Dirección del Seguro Social Campesino solicitó el 18 de marzo de 2016, Memorando No. IESS-DSSC-2016-0804-M, a la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento los expedientes técnicos completos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el objeto de iniciar los respectivos procesos de contratación. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es estrictamente de responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino. La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad absoluta del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Hito Asociado: Los hitos del proyecto no fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino, responsable del mismo hasta el mes de diciembre de 2015.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	04/04/2016 - 06:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2016 La Procuraduría General del IESS remitió el 25 de febrero de 2016 al SSC el contrato para la Fiscalización de la construcción de la unidad médica. El SSC procedió a la suscripción del contrato de Fiscalización de la construcción de la unidad médica el 29 de febrero de 2016. Por tanto, el proceso para la contratación de Fiscalización de la construcción de la unidad médica ha concluido. Con la firma del contrato de Fiscalización, corresponde al Administrador del contrato la autorización del inicio de obra. Riesgo: Una vez superado el problema que ocasionó el no inicio de la obra, es responsabilidad del Administrador el dar inicio inmediato a la ejecución de los trabajos.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	03/03/2016 - 04:30 PM
ENERO 2016 El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil, responsabilidad de la Unidad de Planificación del SSC, concluyó el 11 de enero de 2016 con la suscripción de acta de negociación con el oferente. Vale señalar que el proceso de contratación de la Fiscalización estuvo a cargo de la Unidad de Planificación del SSC desde el mes de diciembre de 2015. Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización. Problema: La Unidad Financiera del SSC no puede emitir la certificación presupuestaria actualizada para la contratación de la Fiscalización, debido a que la utilización de los recursos del SSC para el año 2016 depende de la autorización de las autoridades del IESS. Como consecuencia de este problema, la Dirección del SSC no puede suscribir la resolución de adjudicación respectiva. Una vez solucionado el problema, corresponderá a la Procuraduría General del IESS la elaboración del respectivo contrato.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	03/03/2016 - 04:29 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Solicitud de demasiados requisitos para el proceso de adjudicación del contrato CAUSARIA que se caiga el proceso	08/04/2016	Freed Fabián Villarruel Vinueza	30 %	90	27	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.							
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	03/07/2015		03/07/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/09/2015		28/09/2015		Sí	1.14
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	23/12/2015		06/01/2016		Sí	10.0
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	23/12/2015		31/12/2015		Sí	1.15
8	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	03/03/2016		06/01/2016		Sí	3.0
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico, ejecutada.	3. Planeación	03/03/2016	03/03/2016			No	1.14
10	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático, ejecutada.	3. Planeación	03/03/2016	03/03/2016			No	1.14
11	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario, ejecutada.	3. Planeación	03/03/2016	03/03/2016			No	1.14
12	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016		29/02/2016		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	3.0
14	EJECUCIÓN: Contrato del equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	10.0
15	EJECUCIÓN: Contrato del equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	10.0
16	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	04/04/2016		31/03/2016		Sí	10.0
17	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	18/04/2016		31/05/2016		Sí	8.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	02/05/2016	02/05/2016			No	6.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	02/06/2016	02/06/2016			No	5.0
20	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	01/07/2016	01/07/2016			No	4.0
21	EJECUCIÓN:: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	01/07/2016	01/07/2016			No	3.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario, firmada.	5. Cierre	04/07/2016	04/07/2016			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico , realizada y firmada.	5. Cierre	04/07/2016	04/07/2016			No	2.0
24	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento informático, realizada y firmada.	5. Cierre	04/07/2016	04/07/2016			No	2.0
25	CIERRE Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	01/08/2016	01/08/2016			No	2.0
26	CIERRE:Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	29/08/2016	29/08/2016			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47 **
Monto Total del Proyecto:	664,142.28
Total Devengado:	77,506.10
% Monto Total Devengado:	11.67 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO




% Monto Total Devengado: 11.67 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Aprobado Inicial	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Codificado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Comprometido	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	420,441.81	243,700.47	0.00	664,142.28
Ppto. Devengado	0.00	77,506.10	0.00	77,506.10
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	420,441.81	243,700.47	0.00	664,142.28
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	31.80 %	0.00 %	11.67 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

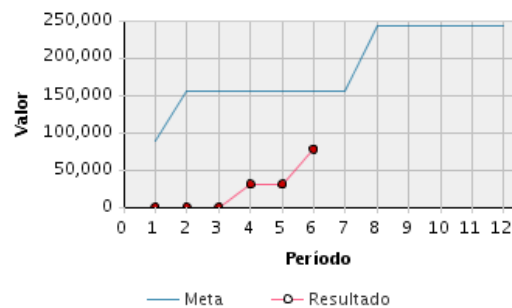

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	88,370.67	0.00	88,370.67	0.00	0.00 %		0.00 %
Feb	66,959.13	0.00	155,329.80	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	155,329.80	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	0.00	30,239.86	155,329.80	30,239.86	19.47 %		12.41 %
May	0.00	0.00	155,329.80	30,239.86	19.47 %		12.41 %
Jun	0.00	47,266.24	155,329.80	77,506.10	49.90 %		31.80 %
Jul	0.00		155,329.80				
Ago	88,370.67		243,700.47				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	243,700.47	77,506.10					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la eficiencia en la gestión de planes y proyectos del SSC MEDIANTE mejoramiento de los procesos

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ABRIL 2016: Reporte avance de obra abril 2016	ABRIL_-IESS_PR_-HUAYRAPUNGO.pdf	06/05/2016
2	Abril 2016: Reporte fotográfico abril 2016	Abril_-fotos_-Huayrapungo.pdf	06/05/2016
3	Enero 2016: Contrato de contrucción suscrito.	Contrato__CONSTRUCCION_HUAYRAPUNGO.pdf	03/03/2016
4	Febrero 2016: Contrato de Fiscalización suscrito.	Contrato_Fiscalización_HUAYRAPUNGO.pdf	03/03/2016
5	Junio 2016: Aplicación enfoque intercultural	Estrategias_de_aplicación_ENFOQUE_INTERCULTURAL.pdf	05/07/2016
6	Junio 2016: Reporte avance de obra y anexo fotográfico	JUNIO_-IESSPR_-HUAYRAPUNGO_-AVANCE_Y_FOTOS.pdf	05/07/2016
7	Marzo 2016: Acta de inicio de obra y reporte de avance de obra	IESS-PR_HUAYRAPUNGO_-MARZO_2016.pdf	04/04/2016
8	Mayo 2016: Anexo fotográfico de avance de obra	MAYO_-HUAYRAPUNGO_-FOTOS_IESSPR.pdf	06/06/2016
9	Mayo 2016: Reporte avance de obra	MAYO_-HUAYRAPUNGO_-A.V.IESSPR.pdf	06/06/2016
10	Respaldo del reporte generado el 07 de enero de 2016 cuando pertenecía a la Subdirección de Control del SSC	Construcción_y_Equipamiento_UM_T_A1_Huayrapungo.pdf	08/04/2016
