*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro Social Campesino**

Unidad Planificación del Seguro Social Campesino

Unidad de Planificación de la Dirección Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I014 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Manzano Guaranguí de la Provincia de Imbabura

Líder del Proyecto:	Villarruel Vinueza, Freed Fabián (fvillarruelv@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Martínez Hernández, Raul Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I014	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 25/08/2016
Fecha de última actualización:	05/07/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	Fecha del siguiente Hito:	01/02/2016

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción
- Construir una infraestructura y equipamiento que permita brindar servicios de salud de calidad, calidez, integrativos e interculturales en el dispensario comunitario. - Fortalecer la red interna de salud del IESS para la atención primaria de salud, mural y extramural a la población del sector rural.
Beneficios Cualitativos
1. Contar con una Unidad Médica que permita solucionar y responder a los requerimientos de salud. 2. Solucionar y responder a los requerimientos de salud de la población. 3. Incorporar el dispensario a la Red Pública de Salud. 4. Fortalecer los servicios de Salud. 5. Incrementar la imagen institucional del IESS.
Tipo de Beneficiario
La unidad médica cubriría para el año 2020 una demanda potencial de 17,266 personas.
Restricciones
1. Tiempo de ejecución del proyecto: ejecución en 6 meses y 6 meses adicionales para la suscripción de la entrega recepción definitiva de la obra. 2. Costo: la construcción y equipamiento de la Unidad Médica tiene un costo aproximado de $ 744.814,80, incluido IVA. 3. Alcance: Construir y equipar una unidad médica con los requerimientos técnicos de la tipología A1.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.07 %
Fecha de Inicio: 05/09/2014 **Fecha de Fin:** 25/08/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

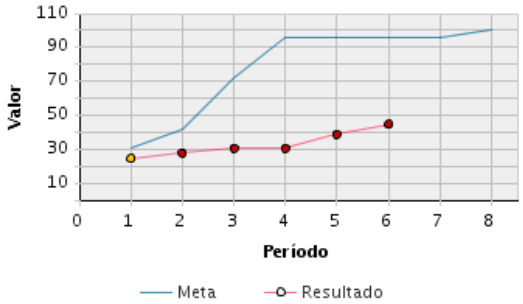

Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2016	Avance programado acumulado											
	31 %	42 %	72 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	25 %	28 %	31 %	31 %	39 %	45 %						
	Estado											
	▼											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016 El 09 de mayo de 2016, por pedido de la Dirección Nacional de Planificación, se actualiza las fechas de cumplimiento de los hitos y se ingresan los datos de ejecución reales del proyecto. La columna "fecha comprometida" de los hitos no ha sido modificada en lo absoluto, por tanto corresponde a la planificación original realizada por la Subdirección de Control del SSC. Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Administrador y el Fiscalizador, correspondiente al mes de junio de 2016. El avance reportado a la fecha es del 56,18%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Por otro lado, cumpliendo con la "Normativa para el ejercicio de las terapias alternativas" emitida por el Ministerio de Salud Pública a través de la Norma No. 000037 de 25 de abril de 2016, la Unidad de Planificación del SSC remitió al Fiscalizador de obra, a través de correo electrónico de 25 de mayo de 2016, las directrices para la implementación de un área destinada a desarrollar el enfoque intercultural en salud en la unidad médica, las cuales se adjuntan. Riesgo: La Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, DNIE, a través de Memorando No. IESS-DNIE-2016-0602-M de 13 de junio de 2016, remitió al Seguro Social Campesino los expedientes técnicos de los componentes de mobiliario y equipamiento médico; sin embargo, el SSC devolvió los expedientes a la DNIE, por medio de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1664-M de 21 de junio de 2016, debido a que no contienen toda la documentación técnica requerida para la contratación a través del portal de compras públicas. Hasta la presente fecha la DNIE no ha remitido los expedientes técnicos completos y corregidos al SSC. Hito Asociado: 18 EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	05/07/2016 - 03:17 PM
MAYO 2016	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	06/06/2016 - 10:53 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El 09 de mayo de 2016, por pedido de la Dirección Nacional de Planificación, se actualiza las fechas de cumplimiento de los hitos y se ingresan los datos de ejecución reales del proyecto. Vale aclarar que la Unidad de Planificación del SSC ha solicitado en reiteradas ocasiones a la DNPL la autorización para modificar, entre otros, los hitos y los montos de ejecución del proyecto, sin que hasta la fecha haya sido atendido el requerimiento. La autorización de modificación solicitada se realiza debido a que la Unidad de Planificación del SSC se ha visto inmersa a partir del mes de enero del 2016 en el ingreso de datos del proyecto al IESS-PR, ya que ha encontrado falencias técnicas en la información ingresada antes del año 2016 por la Subdirección de Control del SSC. La columna "fecha comprometida" de los hitos no ha sido modificada en lo absoluto, por tanto corresponde a la planificación original realizada por la Subdirección de Control del SSC. Se solicita que cualquier pedido de la DNPL a la Unidad de Planificación del SSC sobre el cambio de los datos del proyecto que fueron ingresados en esta herramienta por la Subdirección de Control del SSC, deberá en adelante solicitarse de manera oficial tal requerimiento. Cabe indicar que el 25 de mayo de 2016, a través de Memorando No. IESS-DSSC-2016-1445-M, la Dirección del SSC insistió a los Administradores de contrato en el envío oportuno de la información de avance de obra del proyecto. Por otro lado, se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra, correspondiente al mes de mayo de 2016. El avance reportado es del 40,45%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino. La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, DNIE, la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Cabe señalar que el Seguro Social Campesino requirió a la DNIE la información técnica detallada en el párrafo superior el 18 de marzo de 2016, Memorando No. IESS-DSSC-2016-0840-M, e insistió el 05 de mayo de 2016 en el requerimiento, Memorando No. IESS-DSSC-2016-1287-M. Hito Asociado: 14 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra, ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.		
ABRIL 2016 Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de abril de 2016. El avance reportado es del 25,80%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es estrictamente de responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	05/05/2016 - 04:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Hito Asociado: 14 EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.		
MARZO 2016 El Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista procedieron el 17 de marzo de 2016 a la suscripción del acta de inicio de la ejecución del contrato de obra. En reunión de trabajo del 01 de marzo de 2016 la Unidad de Planificación del SSC entregó al Administrador del contrato la documentación del contrato de fiscalización y además, una "MATRIZ DE ANÁLISIS DEL AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA", la cual debe ser entregada al final de cada mes por el Administrador con el reporte del avance económico de obra. El acta de la reunión se remitió al Administrador el 04 de marzo de 2016 a través del Memorando No. IESS-DSSC-2016-0659-M. Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de marzo de 2016. El avance reportado es del 8.09%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra. Por otro lado, para proceder a la ejecución de los demás componentes del proyecto, y en base a las responsabilidades establecidas en la Resolución No. CD 457, Reglamento Orgánico Funcional del IESS, la Dirección del Seguro Social Campesino solicitó el 18 de marzo de 2016, Memorando No. IESS-DSSC-2016-0804-M, a la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento los expedientes técnicos completos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el objeto de iniciar los respectivos procesos de contratación. Problema: La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es estrictamente de responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino. La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad absoluta del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista. Riesgo: Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación. Hito Asociado: 10 EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	04/04/2016 - 05:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2016 La Procuraduría General del IESS remitió el 25 de febrero de 2016 al SSC el contrato para la Fiscalización de la construcción de la unidad médica. El SSC procedió a la suscripción del contrato de Fiscalización de la construcción de la unidad médica el 29 de febrero de 2016. Por tanto, el proceso para la contratación de Fiscalización de la construcción de la unidad médica ha concluido. Con la firma del contrato de Fiscalización, corresponde al Administrador del contrato la autorización del inicio de obra. Riesgo: Una vez superado el problema que ocasionó el no inicio de la obra, es responsabilidad del Administrador el dar inicio inmediato a la ejecución de los trabajos. Hito Asociado: 8 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	03/03/2016 - 04:02 PM
ENERO 2016 El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil, responsabilidad de la Unidad de Planificación del SSC, concluyó el 11 de enero de 2016 con la suscripción de acta de negociación con el oferente. Vale señalar que el proceso de contratación de la Fiscalización estuvo a cargo de la Unidad de Planificación del SSC desde el mes de diciembre de 2015. Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización. Problema: La Unidad Financiera del SSC no puede emitir la certificación presupuestaria actualizada para la contratación de la Fiscalización, debido a que la utilización de los recursos del SSC para el año 2016 depende de la autorización de las autoridades del IESS. Como consecuencia de este problema, la Dirección del SSC no puede suscribir la resolución de adjudicación respectiva. Una vez solucionado el problema, corresponderá a la Procuraduría General del IESS la elaboración del respectivo contrato. Hito Asociado: 8 EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	Villarruel Vinueza, Freed Fabián	03/03/2016 - 04:00 PM
NOVIEMBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, la formula polinómica ha sido entregada a la Procuraduría General del IESS, tiene que revisar la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento para con este aval firmar el contrato. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se solicita certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA, por cambios en el presupuesto del contrato. Se encuentra en proceso la generación de pliegos con los términos de referencia. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	08/12/2015 - 04:33 PM
OCTUBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA).	Saltos Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 04:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los término de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.		
El 07 de Septiembre de 2015, se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica Manzano Guaranguí, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 03:19 PM
AGOSTO / 2015 En eel proceso COTO-SSC-2015-008, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA MANZANO GUARANGUI, se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Informe de evaluación de las ofertas y Recomendación de adjudicación del proceso de contratación de obra Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 12:39 PM
JULIO / 2015 Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 01/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 17 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-008, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA MANZANO GUARANGUI, PROVINCIA IBARRA, CANTON IBARRA, PARROQUIA SAN MIGUEL DE IBARRA DEL SEGURO SOCIAL CAMEPSINO", por parte de la secretaría de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	03/08/2015 - 03:25 PM
JUNIO/2015: La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1 , realiza la revisión de documentos precontractuales. La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	09/07/2015 - 06:11 PM
ENERO 2015 La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos: 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL . 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. FEBRERO 2015 La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial MARZO 2015 Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. ABRIL 2015	Saltos Galarza, Myrian Catalina	12/06/2015 - 08:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.		

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
	No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	30/06/2015		30/06/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.14
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	01/01/2016		22/12/2015		Sí	10.0
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	04/01/2016		31/12/2015		Sí	1.15
8	EJECUCIÓN: Contrato de fiscaclización, suscrito.	4. Ejecución	11/01/2016		29/02/2016		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	15/01/2016		22/12/2015		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	29/01/2016		31/03/2016		Sí	3.0
11	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico,, ejecutada.	3. Planeación	01/02/2016	01/02/2016			No	1.14
12	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático,, ejecutada.	3. Planeación	01/02/2016	01/02/2016			No	1.14
13	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario,, ejecutada.	3. Planeación	01/02/2016	01/02/2016			No	1.14
14	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	12/02/2016		31/05/2016		Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	01/03/2016	01/03/2016			No	10.0
16	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	01/03/2016	01/03/2016			No	10.0
17	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	01/03/2016	01/03/2016			No	10.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	07/04/2016		30/06/2016		Sí	6.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	21/04/2016	21/04/2016			No	5.0
20	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario., firmada.	5. Cierre	25/04/2016	25/04/2016			No	2.0
21	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	25/04/2016	25/04/2016			No	2.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento informático, realizada y firmada.	5. Cierre	25/04/2016	25/04/2016			No	2.0
23	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	25/04/2016	25/04/2016			No	4.0
24	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	25/04/2016	25/04/2016			No	3.0
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47 **
Monto Total del Proyecto:	664,142.28
Total Devengado:	115,765.86
% Monto Total Devengado:	17.43 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO



% Monto Total Devengado: 17.43 %

Perfil Económico 2016				
	Años Previos	**Año Actual (2016)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	664,142.28	0.00	0.00	**664,142.28**
Ppto. Aprobado Inicial	664,142.28	0.00	0.00	**664,142.28**
Ppto. Codificado	664,142.28	0.00	0.00	**664,142.28**
Ppto. Comprometido	664,142.28	0.00	0.00	**664,142.28**
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	420,441.83	243,700.47	0.00	**664,142.30**
Ppto. Devengado	0.00	115,765.86	0.00	**115,765.86**
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	**0.00**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	420,441.83	243,700.47	0.00	**664,142.30**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	47.50 %	0.00 %	**17.43 %**

*** Ppto. Devengado**

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

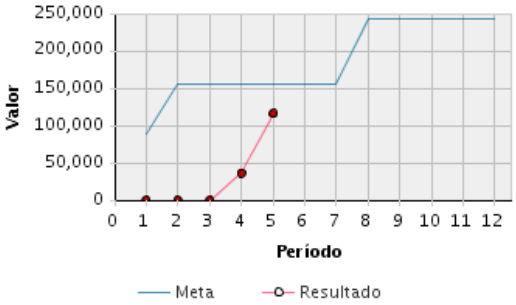

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	88,370.67	0.00	88,370.67	0.00	0.00 %		0.00 %
Feb	66,959.13	0.00	155,329.80	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	155,329.80	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	**Prog. a Devengar (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Prog. a Devengar (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Abr	0.00	36,200.60	155,329.80	36,200.60	23.31 %		14.85 %
May	0.00	79,565.26	155,329.80	115,765.86	74.53 %		47.50 %
Jun	0.00		155,329.80				
Jul	0.00		155,329.80				
Ago	88,370.67		243,700.47				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	**243,700.47**	**115,765.86**					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ABRIL 2016: Reporte avance de obra abril 2016	ABRIL_-_IESS_PR_-_MANZANO_GUARANGUI.pdf	05/05/2016
2	Abril 2016: Reporte fotográfico abril 2016	Abril_-_fotos_-_Manzano_Guarangui.pdf	05/05/2016
3	Enero 2016: Contrato de contrucción suscrito, IESS-PG-2015-0119-C	Contrato_obra_MANZANO_GUARANGUI_IESS-PG-2015-0119-C.pdf	03/03/2016
4	Febrero 2016: Contrato de Fiscalización suscrito	Contrato__Fiscalización_MANZANO_GUARANGUI.pdf	03/03/2016
5	Junio 2016: Aplicación enfoque intercultural	Estrategias_de_aplicación_ENFOQUE_INTERCULTURAL.pdf	05/07/2016
6	Junio 2016: Reporte avance de obra y anexo fotográfico	JUNIO_-_IESSPR_-_MANZANO_GUARANGUI_-_AVANCE_Y_FOTOS.pdf	05/07/2016
7	Marzo 2016: Acta de inicio de obra, reporte de avance de obra y memoria fotográfica	IESS-PR_MANZANO_GUARANGUI_-_MARZO_2016.pdf	04/04/2016
8	Mayo 2016: Anexo fotográfico de avance de obra	MAYO_-_MANZANO_GUARANGUI_-_FOTOS_IESSPR.pdf	06/06/2016
9	Mayo 2016: Reporte avance de obra	MAYO_-_MANZANO_GUARANGUI_-_A.V.IESSPR.pdf	06/06/2016
