

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo**
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
PROYECTO: CGP I008 Unidad Nacional de Medios Complementarios de Diagnóstico

Líder del Proyecto:	Reyes Martinez, Paulina Violeta (preyes@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Programas Relacionados:	
Titular:	Rovalino Tello, Fausto Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	946,000.84
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/05/2014 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	04/07/2016	Fecha de Fin Base:	30/10/2015
Modificado por:	Reyes Martinez, Paulina Violeta	Fecha del siguiente Hito:	15/06/2016

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL

La Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico cuenta con la infraestructura, personal para el desarrollo analítico y pruebas de diagnóstico con equipos de tecnología antigua que limita la respuesta analítica en número y tiempo de respuesta. Para mejorar los servicios preventivos a las empresas se requiere tecnología de punta para ampliar la cobertura analítica, optimizando recursos humanos y económicos.

PROPOSITO

Adquirir equipos de tecnología moderna que permita aumentar la cobertura analítica de los laboratorios en número y tipos de pruebas para las empresas micro y pequeña empresas a nivel nacional, apoyar al proceso de auditorías, investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, dirimencia.

PRODUCTO

Ampliación de cobertura analítica de ambientes laborales y trabajadores expuestos a factores de riesgo

Beneficios Cualitativos

Los beneficiarios serán las empresas del país, que cumplen con los requisitos mínimos de Seguridad y que han solicitado se los incluya en el Programa ya que les permitirá mejorar la gestión técnica, realizar los controles respectivos y hacer la vigilancia de la salud

Tipo de Beneficiario

Micro y pequeña empresa hasta 49 trabajadores
Afiliados

Restricciones

TIEMPO: El proyecto se puede retrasar si se dieran cambios políticos y de la administración


COSTO: La compra parcial de los equipos que limitarán la ejecución del presupuesto asignado

ALCANCE: Retrase el proyecto en el momento de la instalación de equipos presentes defectos de fábrica imposibilitando que se amplie la cobertura del servicio

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 81.63 %

Fecha de Inicio: 08/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

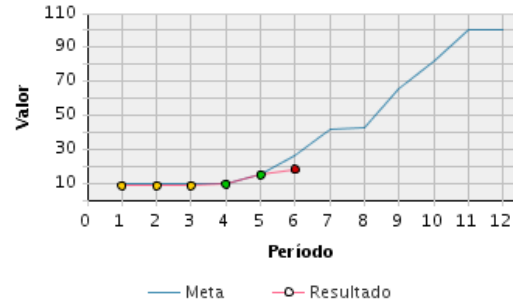

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	9 %	9 %	9 %	9 %	15 %	26 %	41 %	43 %	66 %	82 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	8 %	8 %	8 %	9 %	15 %	18 %						
	Estado											
	▼	▼	▼	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016 1. Con Memorando Nro IESS-DNABS-2016-1170-M del 23/06/2016 se envía a la Procuraduría del IESS el expediente del Cromatógrafo Líquido de Alta Presión, para realizar una modificación del contrato por error manifiesto de hecho producido de buena fe por un funcionario de la Dirección Nacional de Adquisiciones en un párrafo, por lo que hasta el día de hoy no se cancela el 50% del valor restante establecido, aunque la empresa proveedora Instrulab Q ha cumplido con el objeto del contrato mencionado. HITO 6. 2. Con oficio Nro IESS-SDRCSRT-2016-0002-O del 01/06/2016 el administrador del Contrato Nro. IESS-PG-2015-0134C correspondiente al Analizador de Mercurio fija fecha y hora a la empresa Proinstra para la entrega de este equipo en los laboratorios de ésta Dirección. HITO 11. 3. A pedido de la Dirección Nacional de Adquisiciones se solicitó a la Ing Rosario Briones Jefe de la Unidad de Presupuesto de este Seguro la Reforma al PAC 2016 para continuar con el proceso de compra de equipos. Este documento debe ser solicitado por el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que es el ordenador del gasto, y que al momento está vacante. HITO 12. 4. Se envió el 01/06/2016 a la Dirección nacional de Adquisiciones Bienes y Servicio documentos de respaldo sobre la vigencia al 2016 del Proyecto Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico con 6 archivos adjunto. HITO 7. 5. Se envió el mes de mayo los documentos de 6 grupos de equipos, para iniciar con el proceso del portal de compras públicas y que hasta el día de hoy permanecen sin ejecución HITO 7	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/07/2016 - 11:03 AM
Mayo 2016 1. Se entregó el 09/05/2016 a la Dirección Nacional de Planificación los documentos habilitantes para inicio proceso de equipos de apoyo, para la elaboración de pliegos. HITO 7. 2. El 05/05/2016 se entregó a los funcionarios de la Dirección Nacional de Adquisiciones via correo electrónico del IESS los términos de referencia en word de los siguientes equipos: equipos de lectura directa grupo 1, equipos de lectura directa grupo2, contador hematológico, analizador de química clínica, espectrofotómetro ultravioleta visible y equipos de apoyo para que elaboren los pliegos e inicie el proceso del portal de compras públicas, el cual no se ha ejecutado hasta el momento. Después de 25 días de tener esta información solicitaron documentos que justifiquen que el Proyecto Unidad de medios Complementarios de Diagnóstico está vigente para el año 2016. HITO 5. 3. El 03/05/2016 se remitieron las certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de apoyo. HITO 5. 4. El 26/05/2016 se realizó una reunión con los profesionales de la Dirección Nacional de Planificación para modificar los hitos por cada grupo de equipos y editar el presupuesto programado y devengado del Proyecto Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico. HITO 2. 5 El 30/05/2016 se realizó un alcance al Acta final entrega recepción del cromatógrafo líquido de Alta Presión. HITO 9	Reyes Martinez, Paulina Violeta	02/06/2016 - 12:34 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2016 1. Se solicitó el 4 de abril de 2016 al Director general del Seguro de Riesgos del Trabajo un alcance de la certificaciones presupuestarias y PAC de equipos de lectura directa grupo 1 y contador hematológico a través de memorandos Nro.IESS-SDPPPRT-2016-1697 y 1695. HITO 5. 2. El 29-04-2016 se entregó al Director del Seguro Genral de Riesgos del Trabajo las carpetas con los documentos habilitantes para iniciar el proceso de adquisición de los equipos: espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de lectura directa Grupo 1 y Grupo 2, Contador Hematológico y Analizador de Química Clínica. HITO 10. 3. El 29-04-2016 se solicitó al Sr Director del seguro general de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestarias y PAC del equipo y mantenimiento de los equipos de APOYO a través de Memorando Nro. IESS-SDPPPRT-2141-2016 y 2142, los cuales se realizaron nuevamente un estudio de mercado. HITO 5 4. El 25/04/2016 se realizó el acta entrega recepción del cromatografo líquido de Alta Presion HPLC en los Laboratorios de Higiene con la Comisión técnica designada. HITO 7	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/05/2016 - 05:27 PM
Marzo 2016 1. La Unidad de Presupuesto del Seguro de Riesgos del Trabajo emitió las certificaciones presupuestarias para la adquisición del Cromatógrafo de gases, detector FID, Espectrofotómetro ultra violeta visible para iniciar con la elaboración de TDRS. HITO 5 2. Se solicitó al Director del Seguro de Riesgos del Trabajo, designe la emisión de las certificaciones presupuestarias y PAC de los siguiente equipos: Equipos de Lectura Directa grupo 1 y 2, Equipos de Laboratorio Clínico: Contador Hematológico y Analizador de química Clínica, . HITO 5 3. Se solicitó al Director del Seguro de Riesgos del Trabajo, designe la emisión de las certificaciones presupuestarias y PAC de los mantenimientos de los siguiente equipos: Equipos de Lectura Directa grupo 1 y 2, Equipos de Laboratorio Clínico: Contador Hematológico y Analizador de química Clínica. cromatógrafo de gases y espectrofotómetro UVVIS, . HITO 5 4. Se realizó el acta entrega -recepción del concentrador de nitrógeno en los tiempos establecido. HITO 7	Reyes Martinez, Paulina Violeta	01/04/2016 - 03:52 PM
Febrero 2016 1. Se realizó el estudio de mercado con la actualización de proformas de proveedores de los siguientes grupo de equipos: instrumentales, de apoyo, equipos de lectura directa y clínicos para posteriormente solicitar las certificaciones presupuestarias de cada grupo. HITO3. 2. Se realizó el estudio de mercado de los procesos de mantenimiento de los grupos de equipos: instrumentales, apoyo, lectura directa y laboratorio clínico, requisitos de los terminos de referencia de cada grupo de equipos. HITO 3. 3. Se están actualizando los términos de referencia de cada grupo de equipos. HITO 4.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	07/03/2016 - 09:29 AM
ENERO 2016 1. Se realizó el anticipo del 50% del pago del equipo cromatógrafo líquido de alta presión al proveedor INSTRULAB para la repotenciación de los laboratorios de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 7. 2. Se realizó el anticipo del 50% del pago del equipo concentrador de Nitrógeno al proveedor PROINSTRA para la repotenciación de los laboratorios de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 7. 3. Está en proceso de elaboración el contrato de la adquisición del Analizador de Mercurio en la Procuraduría del IESS. HITO 7.	Arellano Ramírez, Homero Alejandro	03/03/2016 - 05:19 PM
DICIEMBRE 2015 1. El proceso de compra del Analizador de Mercurio ha sido adjudicado el 9/12/2015 y se ha negociado el 10/12/2015 con una rebaja del 11,32%, considerando un ahorro económico para la Institución. Hito 6. Adjudicación de contrato iniciado. 2. Se continúa en el mes de diciembre con los procesos de adquisición de equipos correspondiente a los equipos de apoyo, laboratorio clínico y equipos de diagnóstico médico de acuerdo a cronograma establecido en el portal de compras públicas. Hito 10. Proceso iniciado. 3. El 30/12/2015 se recibió en la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo el expediente original con 287 fojas útiles correspondiente al Cromatógrafo líquido de alta presión HPLC que incluye el contrato y póliza del mismo para que ésta Dirección realice la ejecución de la etapa contractual. Hito 7. Contrato suscrito. 4. La Procuraduría del IESS al momento está elaborando el contrato del equipo Concentrador de Nitrógeno adjudicado anteriormente. Hito 7. Contrato suscrito.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/02/2016 - 12:14 PM
Noviembre 2015 Se realizó el 11/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-18-IESS-DNA-15 correspondiente al cromatografo de gases detector FID y espectrofotómetro ultravioleta visible, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/02/2016 - 12:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Se realizó el 17/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-17-IESS-DNA-15 correspondiente a equipos de laboratorio Clínico: Contador Hematológico y Analizador de Química Sanguínea, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado. 3. Se realizó el 16/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-21-IESS-DNA-15 correspondiente a equipos de Apoyo, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado. 4. Se realizó el 26/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-20-IESS-DNA-15 correspondiente a Analizador de Mercurio, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado. 5. Se devolvió el 18/11/2015 a la Dirección Nacional de Adquisiciones las carpetas precontractuales para la elaboración de contratos en la Procuraduría. Hito 7. Contrato suscrito.		
Octubre 2015 1. Se realizó el 02/10/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-11-IESS-DNA-15 correspondiente al cromatógrafo líquido de alta presión, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado 2. Se realizó el 05/10/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-12-IESS-DNA-15 correspondiente al concentrador de nitrógeno, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado 3. Se realizó el 21/10/2015 Memorando IESS-DSGRT-2015-1587-M la sesión de negociación del proceso SIE-12-IESS-DNA-15 para la contratación del equipo concentrador de nitrógeno. HITO6 Adjudicación de contrato 4. Se realizó el 20/10/2015 Memorando IESS-SDPPRTP-2015-5082-M el acta de negociación del proceso SIE-11-IESS-DNA-15 para la contratación del cromatógrafo líquido de alta presión. HITO6 Adjudicación de contrato. 5- Se envió el 27/10/2015 a la Dirección Nacional de Adquisiciones los términos de referencia modificados por pedido nuevamente de ésta Dirección correspondientes a : Cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de laboratorio clínico y Analizador de Mercurio. HITO 8 Ejecución para elaboración de pliegos. 6. La Dirección Nacional de Adquisiciones, responsable de la ejecución de los procesos de adquisición de los equipos de laboratorio del Seguro General de Riesgos del Trabajo, está iniciando el proceso de publicación al portal de compras públicas SERCOP del proceso de contratación de los equipos: cromatógrafo de gases y espectrofotómetro ultravioleta visible, quienes evidencian problemas con la herramienta USHAY del SERCOP. HITO 10 Proceso iniciado.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	27/10/2015 - 03:58 PM
Septiembre 2015 1. Se entregó al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo los documentos precontractuales de los 8 procesos de compra de equipos del proyecto de Unidad de Medios Complementarios en Memorando Nro IESS-SDPPRTP-2015-4409-M del 8 de septiembre de 2015. HITO 8. 2. En Memorando Nro IESS-DSGRT-2015-1365-M del 9 de septiembre de 2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Magister Fausto Rovalino entregó expedientes con documentación precontractual para inicio del proceso de adquisición de equipos de apoyo, concentrador de nitrógeno, equipos de lectura directa y equipos de Diagnóstico Médico al Director Nacional de Adquisiciones, Bienes y Servicio para ejecutar los procesos precontractuales y contractuales del Nivel Central de la Administradora Dirección General y Seguros Especializados, siendo éstas una de sus funciones y responsabilidades. HITO 8. 3. En Memorando Nro IESS-DSGRT-2015-1413-M del 21 de septiembre de 2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Magister Fausto Rovalino entregó expediente con documentación precontractual para inicio del proceso de adquisición de cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de laboratorio clínico, cromatógrafo líquido de alta presión y Analizador de Mercurio al Director Nacional de Adquisiciones, Bienes y Servicio, para ejecutar los procesos precontractuales y contractuales del Nivel Central de la Administradora Dirección General y Seguros Especializados, siendo éstas una de sus funciones y responsabilidades. HITO 8. 4. El 30-09-2015 La Dirección Nacional de Adquisiciones publicó en el Sistema Oficial de Contratación Pública SERCOP el proceso SIE-11-IESS-DNA-15 para iniciar con la adquisición del Cromatógrafo Líquido de Alta Presión con detector de arreglo de diodos y detector de fluorescencia para la repotenciación del Laboratorio de Métodos Complementarios de Diagnóstico del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 10.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	02/10/2015 - 02:02 PM
Agosto 2015 1. Se solicitó el 25/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC de los servicios de mantenimiento de los equipos: analizador de mercurio, cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultra violeta		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
visible, cromatógrafo líquido de alta presión, equipos de lectura directa, concentrador de nitrógeno, requisitos del formato de términos de referencia. HITO5. 2. Se solicitó el 28/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC del servicio de mantenimiento de los equipos del laboratorio clínico, requisito indispensables del formato de términos de referencia. HITO5. 3. Se solicitó el 31/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC del servicio de mantenimiento de los equipos de apoyo y los equipos de diagnóstico médico. HITO 5. 4. La Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo entregó las certificaciones presupuestarias y PAC solicitadas de los servicios de mantenimiento de los equipos para adjuntar en el expediente necesario para iniciar con el proceso de adquisición de equipos contemplados en el proyecto. HITO 6. Julio 2015 1. El 22/07/2015 el Dr. Ernesto Bolaños, Abogado de la Dirección Nacional de Adquisiciones envió a través del correo electrónico institucional, el formato de términos de referencia de los equipos de apoyo con nuevas sugerencias para su modificación, e iniciar con el proceso de compra de este grupo de equipos. HITO 4. 2. Con fecha 08/07/2015 y 09/07/2015 se solicitó nuevamente a las empresas proveedores de algunos equipos de laboratorio, cotizaciones del mantenimiento de estos equipos que se realizarán en los años posteriores a la garantía técnica entregada por cada empresa. HITO 3		
Junio 2015 1. Se entregó el 08/06/2015 al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo los documentos habilitantes para inicio del proceso de Adquisición de Equipos: Espectrofotómetro Ultravioleta Visible, Cromatógrafo de Gases Detector FID, Equipos de Laboratorio Clínico, Equipos de Apoyo y Analizador de Mercurio. HITO 10. 2. En Memorando Nro. IESS-DSGRT-2015-0851-M del 10/06/2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo envió al Director Nacional de Adquisiciones los documentos precontractuales para inicio del proceso de Adquisición de Equipos de Laboratorios de Riesgos del Trabajo. HITO 10. 3. El 18/06/2015 se realizó el cierre de metas de indicadores del proyecto, en coordinación vía telefónica con la Ing Diana Poalasin, funcionaria de la Dirección Nacional de Planificación. HITO 12. 4. El 22/06/2015 el Ing Francisco Leonardo Borja, Director Nacional de Adquisiciones devuelve expediente de procesos precontractuales de adquisición de equipos de laboratorio al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo para completar información requerida para iniciar este proceso. HITO 10. 5. El 24/06/2015 se envió los Términos de Referencia de 4 grupos de equipos, a los Abogados Duarte y Bolaños, Funcionarios de la Dirección Nacional de Adquisiciones para que determinen las modificaciones a realizar en los mismos e iniciar con el proceso de adquisición. HITO 10.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	08/07/2015 - 10:52 AM
Mayo 2015 4. La fecha de entrega de los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio elaborados por la Unidad de Presupuesto del SGRT se entregó en físico el día Martes 26/05/2015, requisito previo para iniciar el proceso de adquisición de equipos, junto con los términos de referencia.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	08/07/2015 - 10:50 AM
Mayo 2015 1. La Unidad de Presupuesto de este Seguro especializado ha entregado los alcances de las certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio requeridos: Cromatografo de gases, espectrofotometro UvVis, HPLC, concentrador de nitrógeno, equipos de apoyo, equipos de lectura directa y Analizador de mercurio, generados por la sobretasa arancelaria, que causó un cambio de valores en el estudio de mercado inicial para determinar el presupuesto referencial de cada grupo de equipos. Hito 5. 2. El Director del Seguro de Riesgos del Trabajo ha designado el 27/05/2015 a los profesionales que van a conformar las comisiones técnicas y Administradores de Contrato de 4 grupos de equipos, requisito del formato de Términos de Referencia. Hito 4. 3. Se ha enviado al Ing Geovanni Vintimilla, Subdirector de Regulación y Control del SGRT en Memorando Nro. IESS-SDPPPRTP-2015-2584-M con fecha 28/05/2015 los términos de referencia y documentos habilitantes de 4 grupos de equipos: Cromatógrafo de gases FID y espectrotómetro UV- Visible, Analizador de Mercurio, Equipos de Laboratorio Clínico y Equipos de Apoyo, para su revisión y aprobación, previo al proceso de adquisición de equipos de laboratorio. Hito 4.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	29/05/2015 - 10:42 AM
Abril 2015 1. Certificaciones PAC y Presupuestarias emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo de los equipos de lectura directa, equipos de apoyo y concentrador de nitrógeno. Hito Asociado 3.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/05/2015 - 11:12 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2 Se solicitó al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo en Memorando IESS-SDPPRTP-2015-1966-M del 22 de abril del presente un alcance de las certificaciones PAC y presupuestaria de los equipos de laboratorio . Hito Asociado 3. 3. El 08 de abril del 2015 se realizó una consulta a la Ing. Maria del Carmen Gaibor de la Dirección Nacional de Adquisiciones, sobre el cálculo de los requerimientos mínimos de proveedores, quien envió via mail los modelos de elaboración de los TDRs. Hito Asociado 4.		
1. Recepción el 12/03/2015 del TDR de equipos instrumentales (cromatografo de gases y espectrofotometro Ultravioleta visible) revisado y corregido por la Direccion Nacional de Adquisiciones. Hito Asociado 2. 2. Certificaciones PAC y Presupuestaria emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo de los equipos de laboratorio clinico y de diagnóstico médico. Hito Asociado 3. 3. Debido a la sobretasa arancelaria impuesta a las importaciones de equipos de laboratorio, se está realizando un nuevo estudio de mercado para solicitar posteriormente los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio. Hito Asociado 3. 4. Se envió a la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo con Memorado IESS-SD-PPRTP-2015-1140-M el 10 de marzo del 2015: Asunto de designación de comisiones técnica, administradores de contrato de los procesos de adquisicion de equipos, solicitados para complementar los términos de referencia determinados por la Dirección Nacional de Adquisiciones. Hito Asociado 4.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/05/2015 - 11:10 AM
Febrero 2015 1. Acta de sesión de trabajo con el Director Nacional de Adquisiciones (9/02/2015) para aclaración de inquietudes sobre la vigencia tecnológica, garantías técnicas del proceso de adquisición de equipos de laboratorio. Hito Asociado 4. 2. Solicitud de certificaciones presupuestaria y PAC solicitadas por los técnicos del área de 6 grupos de equipos, (pendientes 2) debido a la falta de cotizaciones requeridas para el estudio de mercado que permiten determinar el valor referencial . El día 02/03/2015 se emitieron 3 certificaciones PAC y presupuestarias correspondientes a 3 grupos de equipos. Hito Asociado 3 3. El 09/02/2015 se entregó al Director Nacional de Adquisiciones el TDR de equipos instrumentales para su revisión y modificación. Hito Asociado 4 4. Se sugiere que las fechas establecidas en los hitos del proyecto sean ampliadas,razón por la cual el presupuesto devengado debe variar.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	02/03/2015 - 10:28 AM
ENERO 2015: 1. Correccion de documentacion ficha y perfil proyectos requeridas por la DNPL. Hito Asociado: 1 2. Consulta de información sobre TDRs realizados en procesos similares a la adquisicion de equipos de instituciones publicas (INAMI y Patrimonio Cultural) y Dirección Provincial IESS (Adjudicación de equipamiento médico). Hito Asociado:4	Reyes Martinez, Paulina Violeta	28/01/2015 - 09:32 AM
El proyecto se comenzó a postular en enero del 2014, cuando se identificó la necesidad de adquirir equipos con nueva tecnología y en mayo se postuló con el aval del Dr. Luis Vásquez , el proyecto busca renovar y repotenciar los laboratorios, constituyéndolo en la Unidad Nacional de Medios complementarios de diagnóstico con la tecnología y competencia para desarrollar análisis e investigaciones específicas en seguridad y salud en el trabajo , que permita incluso la dirimencia de estudios ambientales y biológicos en las auditorías	Reyes Martinez, Paulina Violeta	27/01/2015 - 01:53 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso de elaboración de pliegos e inicio proceso del portal de compras públicas	03/06/2016	Paulina Violeta Reyes Martinez	80	80	64	0/0
Retraso en la entrega de contratos de equipos adjudicados en la Procuraduría	03/06/2016	Paulina Violeta Reyes Martinez	50	50	25	0/1

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Objetivos.1. General. Falta de oferentes en el portal web CAUSARÍA la adquisición parcial de equipos, insumos y reactivos	03/06/2016	Paulina Violeta Reyes Martinez	30 %	70	21	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada.	2. Definición	27/01/2015		27/01/2015		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN:Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/01/2015		27/01/2015		Sí	4.0
3	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada, TDR validado del concentrador de nitrógeno, HPLC, Analizador de Mercurio	3. Planeación	15/04/2015		21/04/2015		Sí	0.73
4	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado del concentrador de nitrógeno, HPLC, Analizador de Mercurio	4. Ejecución	08/10/2015		02/12/2015		Sí	0.31
5	EJECUCIÓN: Contrato del Concentrador de Nitrógeno, HPLC y Analizador de Mercurio adjudicado	4. Ejecución	15/10/2015		10/12/2015		Sí	0.31
6	EJECUCIÓN: Contrato del Concentrador de Nitrógeno, HPLC y Analizador de Mercurio suscrito	4. Ejecución	08/01/2016		07/04/2016		Sí	0.93
7	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de los Equipos de Lectura Directa Grupo 1 y Grupo 2, Contador Hematológico, Analizador de Química Clínica, Espectrofotómetro UV Visible, Equipos de Apoyo	3. Planeación	05/05/2016		31/05/2016		Sí	0.73
8	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de equipos de apoyo 2	3. Planeación	15/05/2016		15/05/2016		Sí	0.73
9	EJECUCIÓN: Concentrador de Nitrógeno, HPLC entregados, instalados, y personal	4. Ejecución	20/05/2016		25/05/2016		Sí	3.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas							
10	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de Cromatografo de Gases detectaor FID Y PID	3. Planeación	30/05/2016		19/05/2016		Sí	0.73
11	EJECUCIÓN: Analizador de Mercurio entregado, instalado y personal capacitado en el uso del equipo con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	02/06/2016		30/06/2016		Sí	3.23
12	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Equipos de Lectura Directa Grupo 1	4. Ejecución	12/06/2016	24/06/2016			No	0.31
13	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Equipos de Lectura Directa Grupo 2	4. Ejecución	13/06/2016	24/06/2016			No	0.31
14	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Espectrofotómetro Ultravioleta	4. Ejecución	13/06/2016	24/06/2016			No	0.31
15	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Contador Hematológico	4. Ejecución	14/06/2016	24/06/2016			No	0.31
16	EJECUCIÓN: Contrato de Equipos de Lectura Directa Grupo 1 adjudicado	4. Ejecución	15/06/2016	18/06/2016			No	0.31
17	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Analizador de Química Clínica	4. Ejecución	15/06/2016	15/06/2016			No	0.31
18	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de equipos de lectura directa grupo 3	3. Planeación	15/06/2016	15/06/2016			No	0.73
19	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de Horno de grafito	3. Planeación	15/06/2016	15/06/2016			No	0.73
20	EJECUCIÓN: Contrato de Equipos de Lectura Directa Grupo 2 adjudicado	4. Ejecución	16/06/2016	19/06/2016			No	0.31
21	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados , proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Equipos de Apoyo	4. Ejecución	16/06/2016	16/06/2016			No	0.31
22	EJECUCIÓN: Contrato del Contador Hematológico adjudicado	4. Ejecución	17/06/2016	20/06/2016			No	0.31

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Contrato del Analizador de Química Clínica adjudicado	4. Ejecución	18/06/2016	21/06/2016		▼	No	0.31
24	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de equipos de diagnóstico	3. Planeación	18/06/2016	20/06/2016		▼	No	0.73
25	EJECUCIÓN: Contrato del Espectrofotometro Ultravioleta visible adjudicado	4. Ejecución	19/06/2016	22/06/2016		▼	No	0.31
26	EJECUCIÓN: Contrato de Equipos de Apoyo adjudicado	4. Ejecución	20/06/2016	23/06/2016		▼	No	0.31
27	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Cromatógrafo de Gases detector FID	4. Ejecución	23/06/2016	24/06/2016		▼	No	0.31
28	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado del Horno de Grafito	4. Ejecución	24/06/2016	25/06/2016		▼	No	0.31
29	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Equipos de Lectura Directa Grupo 3	4. Ejecución	25/06/2016	26/06/2016		▼	No	0.31
30	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Equipos de Apoyo 2	4. Ejecución	26/06/2016	27/06/2016		▼	No	0.31
31	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Equipos de Diagnóstico	4. Ejecución	26/06/2016	27/06/2016		▼	No	0.31
32	EJECUCIÓN: Contrato del Cromatógrafo de Gases detector FID adjudicado	4. Ejecución	30/06/2016	02/07/2016		▼	No	0.31
33	EJECUCIÓN: Contrato del Horno de Grafito adjudicado	4. Ejecución	01/07/2016	05/07/2016		▼	No	0.31
34	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de lectura directa Grupo 3 adjudicado	4. Ejecución	02/07/2016	06/07/2016		▼	No	0.31
35	EJECUCIÓN: Contrato del Equipos de Diagnóstico adjudicado	4. Ejecución	03/07/2016	07/07/2016		▼	No	0.31
36	EJECUCIÓN: Contrato del Equipo de Apoyo 2 adjudicado	4. Ejecución	04/07/2016	08/07/2016		▼	No	0.31
37	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de lectura directa grupo 1 suscrito	4. Ejecución	17/07/2016	20/07/2016		▼	No	0.93
38	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de lectura directa grupo 2 suscrito	4. Ejecución	18/07/2016	21/07/2016		▼	No	0.93
39	EJECUCIÓN: Contrato del contador hematológico suscrito	4. Ejecución	19/07/2016	22/07/2016		▼	No	0.93
40	EJECUCIÓN: Contrato del analizador de química clínica suscrito	4. Ejecución	20/07/2016	23/07/2016		▼	No	0.94

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
41	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de reactivos Lab clínico	3. Planeación	20/07/2016	22/07/2016		▼	No	0.73
42	EJECUCIÓN: Contrato del espectrofotometro ultravioleta visible suscrito	4. Ejecución	21/07/2016	24/07/2016		▼	No	0.94
43	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de reactivos Lab de Higiene	3. Planeación	21/07/2016	23/07/2016		▼	No	0.72
44	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de apoyo suscrito	4. Ejecución	22/07/2016	25/07/2016		▼	No	0.94
45	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de insumos Lab Clínico	3. Planeación	22/07/2016	24/07/2016		▼	No	0.72
46	EJECUCIÓN: Contrato del cromatógrafo de gases suscrito	4. Ejecución	23/07/2016	26/07/2016		▼	No	0.94
47	PLANEACION: Estudio de mercado realizado, certificación presupuestaria otorgada y PAC, TDR validado de insumos Lab Higiene	3. Planeación	23/07/2016	25/07/2016		▼	No	0.72
48	EJECUCIÓN: Contrato del Horno de grafito suscrito	4. Ejecución	24/07/2016	27/07/2016		▼	No	0.94
49	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de lectura directa grupo 3 suscrito	4. Ejecución	25/07/2016	28/07/2016		▼	No	0.94
50	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de diagnóstico suscrito	4. Ejecución	26/07/2016	29/07/2016		▼	No	0.94
51	EJECUCIÓN: Contrato de equipos de apoyo 2 suscrito	4. Ejecución	27/07/2016	30/07/2016		▼	No	0.94
52	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Reactivos Lab Higiene	4. Ejecución	27/07/2016	01/08/2016		▼	No	0.32
53	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Reactivos Lab Clínico	4. Ejecución	28/07/2016	02/08/2016		▼	No	0.32
54	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Insumos Laboratorio Higiene	4. Ejecución	29/07/2016	03/08/2016		▼	No	0.32
55	EJECUCIÓN: Pliegos elaborados, proceso en portal de compras públicas SERCOP iniciado de Insumos Laboratorio Clínico	4. Ejecución	30/07/2016	04/08/2016		▼	No	0.32
56	EJECUCIÓN: Contrato de Reactivos de Laboratorio de Higiene adjudicado	4. Ejecución	08/08/2016	11/08/2016		▼	No	0.32

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	EJECUCIÓN: Contrato de Reactivos de Laboratorio Clínico adjudicado	4. Ejecución	09/08/2016	12/08/2016		▼	No	0.32
58	EJECUCIÓN: Contrato de Insumos Laboratorio de Higiene adjudicado	4. Ejecución	10/08/2016	13/08/2016		▼	No	0.32
59	EJECUCIÓN: Contrato de Insumos Laboratorio Clínico adjudicado	4. Ejecución	11/08/2016	14/08/2016		▼	No	0.32
60	EJECUCIÓN: Contrato de Reactivos Laboratorio de Higiene suscrito	4. Ejecución	09/09/2016	12/09/2016		▼	No	0.94
61	EJECUCIÓN: Contrato de Reactivos Laboratorio Clínico suscrito	4. Ejecución	10/09/2016	13/09/2016		▼	No	0.94
62	EJECUCIÓN: Contrato de Insumos laboratorio higiene suscrito	4. Ejecución	11/09/2016	14/09/2016		▼	No	0.94
63	EJECUCIÓN: Contrato de Insumos laboratorio clínico suscrito	4. Ejecución	12/09/2016	15/09/2016		▼	No	0.94
64	EJECUCIÓN: Equipos de Diagnóstico entregados, instalados y personal capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	22/09/2016	22/09/2016		●	No	3.24
65	EJECUCIÓN: Equipos de Apoyo 2 entregados, instalados y personal capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	23/09/2016	23/09/2016		●	No	3.24
66	EJECUCIÓN: Equipos de Lectura Directa Grupo 3 entregados, instalados y personal capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	23/09/2016	23/09/2016		●	No	3.24
67	EJECUCIÓN: Equipos de Lectura Directa Grupo 1 entregados, instalados y personal capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	27/09/2016	27/09/2016		●	No	3.23
68	EJECUCIÓN: Equipos de Apoyo entregados, instalados y personal capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	28/09/2016	28/09/2016		●	No	3.23
69	EJECUCIÓN: Equipos de Lectura Directa Grupo 2 entregados, instalados y personal capacitado en el uso de los equipos con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	28/09/2016	28/09/2016		●	No	3.23
70	EJECUCIÓN: Contador Hematológico entregado, instalado y personal capacitado en el uso del equipo con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	12/10/2016	12/10/2016		●	No	3.23
71	EJECUCIÓN: Analizador de Química Clínica entregado,	4. Ejecución	13/10/2016	13/10/2016		●	No	3.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	instalado y personal capacitado en el uso del equipo con pruebas desarrolladas							
72	EJECUCIÓN: Espectrofotómetro Ultravioleta Visible entregado, instalado y personal capacitado en el uso del equipo con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	14/10/2016	14/10/2016			No	3.23
73	EJECUCIÓN: Cromatógrafo de Gases detector FID entregado, instalado y personal capacitado en el uso del equipo con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	24/10/2016	24/10/2016			No	3.24
74	EJECUCIÓN: Horno de Grafito entregado, instalado y personal capacitado en el uso del equipo con pruebas desarrolladas	4. Ejecución	25/10/2016	25/10/2016			No	3.24
75	EJECUCIÓN: Reactivos del Laboratorio de Higiene entregados e ingresados con cumplimiento de calidad.	4. Ejecución	10/11/2016	10/11/2016			No	3.24
76	EJECUCIÓN: Reactivos del Laboratorio Clínico entregados e ingresados con cumplimiento de calidad.	4. Ejecución	11/11/2016	11/11/2016			No	3.24
77	EJECUCIÓN: Insumos del Laboratorio de Higiene entregados e ingresados con cumplimiento de calidad.	4. Ejecución	12/11/2016	12/11/2016			No	3.24
78	EJECUCIÓN: Insumos del Laboratorio Clínico entregados e ingresados con cumplimiento de calidad.	4. Ejecución	13/11/2016	13/11/2016			No	3.24
79	CIERRE: Producto Aceptado de equipos, reactivos, e insumos	5. Cierre	30/11/2016	30/11/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de capacitacion en uso de equipos recibidas		102.07 %	0.14	0.1429	01/03/2016	Mayo
2	Porcentaje de metodologías aprobadas		100.00 %	3	3	01/05/2016	Mayo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	946,000.84 **
Monto Total del Proyecto:	1,040,728.00
Total Devengado:	177,635.44
% Monto Total Devengado:	17.07 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO




% Monto Total Devengado: 17.07 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Codificado	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Comprometido	562,970.00	0.00	0.00	562,970.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	1,040,728.00	946,000.84	0.00	1,986,728.84
Ppto. Devengado	0.00	177,635.44	0.00	177,635.44
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,040,728.00	946,000.84	0.00	1,986,728.84
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	18.78 %	0.00 %	8.94 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

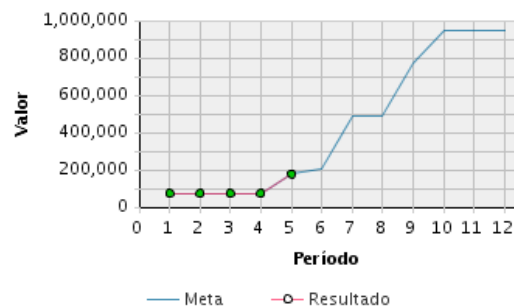

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	74,991.47	74,991.47	74,991.47	74,991.47	100.00 %		7.93 %
Feb	0.00	0.00	74,991.47	74,991.47	100.00 %		7.93 %
Mar	0.00	0.00	74,991.47	74,991.47	100.00 %		7.93 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	0.00	0.00	74,991.47	74,991.47	100.00 %		7.93 %
May	102,643.97	102,643.97	177,635.44	177,635.44	100.00 %		18.78 %
Jun	27,652.50		205,287.94				
Jul	282,856.45		488,144.39				
Ago	0.00		488,144.39				
Sep	282,856.45		771,000.84				
Oct	175,000.00		946,000.84				
Nov	0.00		946,000.84				
Dic	0.00		946,000.84				
Total	946,000.84	177,635.44					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar el conocimiento en los temas preventivos de Seguridad y Salud MEDIANTE la implementacion de actividades de promocion de la seguridad y salud

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
IESS-011	SGRT Promoción y prevención en la salud ocupacional

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	hito 10. Procesos iniciado de equipos de apoyo, equipos laboratorio clinico y de diagnóstico médico	procesos_sercop.pdf	05/01/2016
2	hito 10. Procesos Iniciado: espectrofotometro ultravioleta visible, equipos de lectura directa grupo 1 y grupo 2, contador hematologico y analizador de quimica clinica	of_documentos_habilitantes_29_04_2016.pdf	04/05/2016
3	HITO 10: CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE COMPRA HPLC PARA INICIO DEL PROCESO DE COMPRA	CONDICIONES_GENERALES_SIE-11-IESS-DNA-15.doc	02/10/2015
4	HITO 10: Documentos habilitantes para inicio proceso de adquisicion de equipos de laboratorio	documentos__IESS_JUNIO_2015.pdf	30/06/2015
5	HITO 10: publicación de proceso SIE-11-IESS-DNA-15 de HPLC en el Sistema Oficial de Contratación P{ublica	sercop_publicacio_hplc.pdf	02/10/2015
6	HITO 2: PERFIL DE PROYECTO	perfil_2015_28.PDF	02/03/2015
7	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE CONCENTRADOR DE NITROGENO	certificacion_concentrador.PDF	29/04/2015
8	HITO 3: ALCANCE CERTIFICACIONES PAC Y PRESUPUESTARA DE EQUIPOS DE LABORATORIO	alcance_certificaciones_equipos.PDF	29/04/2015
9	HITO 3: CERTICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPO DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO	certificaciones_lab__clinico_y_diagnosti.PDF	30/03/2015
10	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE EQUIPOS DE APOYO	certificacion_equipos_de_apoyo.PDF	29/04/2015
11	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA	certiicacion_equipos_lectura_directa.PDF	29/04/2015
12	HITO 4: CAMBIOS SUGERIDOS EN EL FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE APOYO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES	sugerencias_tdr_equipo_apoyo.pdf	03/08/2015
13	HITO 4: COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	correo_mantenimiento_equipo.pdf	03/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	HITO 4: DESIGNACION DE COMISIONES TECNICAS DR. LUIS VASQUEZ DIRECTOR DEL SGRT	DESIGNACION_DE_COMISIONES_DR._VASQUEZ_4_GRUPOS.pdf	29/05/2015
15	HITO 4: LINEAMIENTO PARA MODIFICACION DE TDR	ACTA_DE_REUNION_ING._ESTRELLA.PDF	02/03/2015
16	HITO 4: SOLICITUD DE COMISIONES PARA PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	solicitud_de_comisiones.pdf	30/03/2015
17	HITO 4: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE LABORATORIO (4 GRUPOS) AL SUBDIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DEL SGRT	SOLICITUD_DE_REVISION_Y_APROBACION_DE_TERMINOS_DE_REFERENCIA_4_GRUPOS.pdf	29/05/2015
18	HITO 4: TDR DE EQUIPO INSTRUMENTAL CORREGIDO POR DNA	TDR_CG_y_UVVis_corregido_Byron_Estrella.pdf	30/03/2015
19	HITO 5. CERTIFICAION PRESUPUEATRIA Y PAC EMITIDAS DE EQUIPOS DE APOYO	solicitud_cert_presup_manteni_equipos_de_apoyo_29_04_2016.pdf	02/06/2016
20	HITO 5: ALCANDE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE LOS 6 GRUPOS DE EQUIPOS SOLICITADOS	36275099.pdf	29/05/2015
21	HITO 5: Asignación de Certificaciones Presupuestarias y PAC del cromatografo de gases y espectrofotometro	certificación_asignadas_cg_y_espectro.pdf	01/04/2016
22	HITO 5: MEMORANDO DE ALCANCE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPOS DE LABORATORIO EMITIDAS 26/05/2015	IESS-UPSRT-2015-0142-M.pdf	29/05/2015
23	HITO 5: SOLICITUD DE ALCANCE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL 07/05/2015	35561436.pdf	29/05/2015
24	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	cert.pago.equp.lec.dirc.grupo1.pdf	01/04/2016
25	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	cert._mant._eq._lec._direc._gru1.pdf	01/04/2016
26	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	cert._mant._eq._lec._direc._gru2.pdf	01/04/2016
27	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	cert._pago_eq._lec._direc._grupo2.pdf	01/04/2016
28	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_cert_analizador_quimica.pdf	01/04/2016
29	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_cert_mant_analizador_quimica.pdf	01/04/2016
30	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_cert_contador_hematologico.pdf	01/04/2016
31	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_cert_mant_contador_hema.pdf	01/04/2016
32	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_certific_cg.pdf	01/04/2016
33	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_cert_mant_cg.pdf	01/04/2016
34	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_certif_espectro_uvvis.pdf	01/04/2016
35	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos	of_cert_mant_esp_uvvis.pdf	01/04/2016
36	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos DE EQUIPOS DE aPOYO	solicitud_cert_presup_equipos_de_apoyo_29_04_2016.pdf	04/05/2016
37	HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y PAC de equipos y mantenimientos DE EQUIPOS DE aPOYO	solicitud_cert_presup_manteni_equipos_de_apoyo_29_04_2016.pdf	04/05/2016
38	HITO 6. Adjudicación de contrato	acta_de_negociación.pdf	27/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
39	HITO 6: ADJUDICACION DE CONTRATO DE ANALIZADOR DE MERCURIO	acta_negociacion_analizador_hg-1.pdf	05/01/2016
40	HITO 6: Adjudicación de contrato	IESS-SDPPPRTP-2015-5071-M.pdf	27/10/2015
41	HITO 6: Adjudicación de contrato	memo_comisiOn.pdf	27/10/2015
42	HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-DNA-15	acta_de_negociacion.pdf	27/10/2015
43	HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-DNA-15	IESS-DSGRT-2015-1587-M_ACTA_DE_NEGOCIACIÓN.pdf	27/10/2015
44	HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-DNA-15	memorando_iesse-dsgrt-2015-1585-m_ACTA_DE_NEGOCIACION_SYLVIA.pdf	27/10/2015
45	HITO 7. ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITANTES INICIO PROCESO EQUIPOS DE APOYO	documentos_equipos_de_apoyo_9_05_2016.pdf	02/06/2016
46	hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 2016	hoja_de_ruta_proyecto.pdf	04/07/2016
47	hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 2016	coordinacion_gral_de_prestaciones.pdf	04/07/2016
48	hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 2016	informe_proyectos_2016_fr.pdf	04/07/2016
49	hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 2016	infrme_tecnico.pdf	04/07/2016
50	hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 2016	portafolio_dr_proyecto_2015.pdf	04/07/2016
51	hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO 2016	resumen_acta_cd_673.pdf	04/07/2016
52	HITO 7: ACTA ENTREGA RECEPCION DEL CONCENTRADOR DE NITROGENO	acta_recepcion_conc_nitrog.pdf	01/04/2016
53	HITO 7: ACTA ENTREGA RECEPCION DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PRESION	of_director_acta_entrega_hplc.pdf	04/05/2016
54	HITO 7: CONTRATO SUSCRITO DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PRESION HPLC	contrato_hplc.pdf	05/01/2016
55	HITO 8: PLIEGOS ELABORADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES APROBADO	PLIEGOS_SIE-11-IESS-DNA-15.pdf_30_09_2015.pdf	02/10/2015
56	HITO 8: RESOLUCION ADMINISTRATIVA PROCESO DE COMPRA DE HPLC	RESOLUCIÓN_DE_INICIO_DE_PROCESO_SIE-11-IESS-DNA-15.docx	02/10/2015
57	HITO 9. ENTREGA MEMORANDO ALCANCE ACTA FINAL ENTREGA RECEPCION HPLC 30/05/2016	Alcance_Acta_Final_HPLC_30-05-2016.pdf	02/06/2016
58	HITO6: Adjudicación de contrato	IESS-SDPPPRTP-2015-5082-M.pdf	27/10/2015
59	HITO8: ENVIO DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DE 8 PROCESOS DE COMPRA DE DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO PARA INICIO DE PROCESO	memo_envio_documentos_precontractualea.pdf	02/10/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Reyes Martinez, Paulina Violeta	Lidel del Proyecto	Bioquimica	preyes@iesse.gob.ec	3982700 ext 1061
Torres Moyano, Patricia	Coordinador metodológico	Funcionario DGSRT	patyto60@gmail.com	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Patrocinador del Proyecto	Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo	lvasquezz@iess.gob.ec	
